

福知山市公共施設マネジメント 令和6年度実施計画進捗状況報告書



福知山市公共施設マネジメント推進本部

目次

1 進捗状況報告の目的	1
2 到達度評価	1
(1) 検証の対象	1
(2) 到達度の区分	1
(3) 後期実施計画の対象施設数について	2
3 令和6年度実施計画進捗状況のまとめ	3
(1) 進捗概要	3
(2) 取組概要	6
(3) 進捗状況に対する評価	9
(4) 今後の取組の進め方について	10
4 用途大分類 年度別進捗状況	12
(1) 公用施設	13
(2) 教育施設	15
(3) 公営住宅	17
(4) 市民文化系施設	19
(5) 医療施設	21
(6) 子育て支援施設	23
(7) 保健・福祉施設	25
(8) 産業系施設	27
(9) 観光・宿泊(研修)施設	29
(10) 生涯学習系施設	31
(11) その他	33

1 進捗状況報告の目的

福知山市の公共施設マネジメントは、平成 26 年度に策定した「基本方針」及び「基本計画」を着実に推進するため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定めた「実施計画」を 5 年ごとに策定し、計画を進めています。

「前期実施計画（H27～R1）」の実績や課題を踏まえて、令和 2 年 7 月に「後期実施計画（R2～R6）」を策定し、再配置方針を整理しました。

また、後期実施計画で定めた再配置区分に基づき、令和 3 年 3 月に「個別施設計画（R3～R12）」を策定し、個々の公共施設の長寿命化等に向けた取組やその効果について取りまとめました。

本報告書では、前期実施計画から取組を進めている公共施設の総量削減に加え、新たに存続する施設の長寿命化や用途廃止を行い遊休資産となった施設の活用等、総コスト削減につながる取組についても進捗管理を行い、公共施設マネジメント全体の進捗状況として評価・検証することで、市民の皆様に公共施設マネジメントの取組を理解していただくことを目的とします。

2 到達度評価

（1）検証の対象

到達度検証の対象は、後期実施計画で定められた再配置区分の全て（「存続（長寿命化）」「存続（更新）」「用途変更」「統合」「譲渡」「用途廃止」）を対象として、到達度を検証・把握します。

前期実施計画では、削減する施設を中心に進捗管理を行っていましたが、計画的な長寿命化対策等により施設を安全かつ良好な状態に保つため、後期実施計画では、存続する施設についても進捗管理を行うこととしています。

ただし、再配置区分が「存続（長寿命化・更新なし）」の施設は、後期実施計画期間中に具体的な取組が実施されないため原則対象外とし、必要に応じて到達度を検証します。

（2）到達度の区分

到達度については、対象施設の再配置区分により①「存続対象施設（長寿命化等の対策を行う施設）」と②「削減対象施設（除却等を行う施設）」の 2 つに分類し、整理します。

到達度は、1 未着手、2 着手済、3 課題の明確化、4 合意、5 事業中、6 完了の 6 段階に区分して公共施設マネジメントの進捗状況を把握します。

6 段階に区分することにより、それぞれの段階で生じる課題に対して適切な推進策を講じることが可能となります。

特に「4 合意」の段階については、利用者等との間で再配置（存続、削減）に関する諸課題解決の方向性について、具体的な事業実施に関する合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階としています。

① 存続対象施設(長寿命化等の対策を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	長寿命化等の計画について関係者との協議が未着手
2 着手済	具体的な対策内容や時期について関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	必要な対策や時期が関係者との間で明確に共有されたうえで、事業化に向けて協議している段階
4 合意	必要な対策の内容や時期について庁内調整が整い、後期計画期間中を目安に事業化の合意形成が図れた段階
5 事業中	施設を長く使用するために、建物や設備の耐久性が高まる長寿命化等に関する以下の大規模改修の設計・工事に着手している段階 ・外壁（外断熱工事、塗装工事など） ・屋上防水（シート防水、屋上断熱など） ・給排水管更新（高架水槽の更新を含む） ・用途変更に伴う間取り、構造変更等の大規模改修 ・LED 化工事 等
6 完了	工事の完了

※存続施設に関しては、後期実施計画（5年間）に実施する対策について進捗を管理します。

※再配置区分が存続（長寿命化・更新なし）の施設であっても、改修を実施する場合は進捗を管理します。

② 削減対象施設(除却等を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	関係者との協議が未着手で内部検討の段階
2 着手済	関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議している段階
4 合意	課題解決に向けて、具体的な事業実施に関する合意形成が図れた段階
5 事業中	手続 登記上の整理や法的に必要な手続きに着手している段階 ・土地の測量、分筆 ・不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・家屋譲渡等届出書（庁内） ・条例改正 等
	工事 譲渡のための機能補修や除却にかかる設計・工事に着手している段階
6 完了	手続き及び工事の完了、施設の引渡し

※削減対象施設に関しては、対象となっているすべての施設について進捗を管理します。

(3) 後期実施計画の対象施設数について

公共施設マネジメントの対象施設は、基本計画策定時点で 734 施設 459,502 m²でした。

実施計画では、公園（106 施設 3,169 m²）やバス待合所、トイレなど比較的小規模な施設（40 施設 2,926 m²）は修繕等の費用が比較的安価であるため、進捗管理の対象施設から除外しています。

また、複合施設は同一建物でも機能が異なる場合は複数施設とする機能単位で整理していましたが、長寿命化計画を策定するにあたり、施設の機能や構造、耐用年数により一部施設数を変更しています。そして、前期実施計画期間中の実績としては、95 施設 19,923 m²を削減したことにより、後期実施計画は、対象施設を 534 施設 429,281 m²として取組をスタートしています。

3 令和 6 年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 対象施設にかかる到達度別の進捗状況

(表 1) 到達度進捗状況表(施設数)では、公共施設マネジメント後期実施計画の再配置区分に基づき、後期実施計画期間の進捗状況について、施設数で取りまとめています。

令和 6 年度は、存続対象施設において、「存続(長寿命化)」の施設が 22 施設、「存続(長寿命化・更新なし)」の施設が 5 施設、「統合(存続)」の施設が 2 施設の合計 29 施設の再配置が完了しました。削減対象施設では、「統合(廃止)」の施設が 7 施設、「譲渡」の施設が 8 施設、「用途廃止(除却)」の施設が 2 施設、「用途廃止(検討)」の施設が 5 施設の合計 22 施設が完了しました。全体の合計では、51 施設の再配置が完了しました。

再配置区分別では、存続対象としている 265 施設のうち 170 施設について長寿命化等の協議に着手し、着手率は 64.2%となっています。長寿命化等の対策の実施に合意ができている施設数は 113 施設であり、合意率は 42.6%となっています。

削減対象施設では、全ての施設について除却等の協議に着手しています。うち、除却等の実施に合意ができている施設数は 189 施設であり、合意率は 70.3%となっています。

全体では、534 施設のうち再配置について関係者等との合意ができている施設数は 302 施設であり、合意率は 56.6%となっています。

イ 削減対象施設の進捗状況(延床面積)

(表 2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)では、後期実施計画期間の進捗状況について、延床面積で取りまとめています。

令和 6 年度は再配置区分で削減対象としている施設のうち 7,682 m²の再配置が完了しました。再配置区分が「譲渡」の完了面積は 2,109 m²となり、延床面積の削減につながっています。

また、旧有仁小学校や旧三岳青少年山の家などについては貸付のため延床面積の削減にはつながっていませんが、全体の完了面積に大きく寄与しています。

令和 6 年度における進捗状況では、全ての施設において着手しており、実施について合意ができている面積は 82,089 m²あり、合意率は 77.8%となっています。

ウ 中期目標に対する削減進捗状況(削減面積・削減効果額)

(表 3) 中期目標に対する削減進捗状況表では、基本計画の中期目標に対する後期実施計画期間の累計削減実績と削減効果額の進捗状況を取りまとめています。

令和 6 年度は再配置が完了した 51 施設のうち、20 施設 7,282 m²が除却等の延床面積の削減につながり、過去 10 年間で最も多い削減面積となりました。令和 6 年度までの累計削減実績は 189 施設 42,632 m²となり、基本計画で設定した中期目標の 101,800 m²に対し達成率は 41.9%となっています。

令和 6 年度の削減効果額は 23 億 7,000 万円となり、令和 6 年度までの累計では 138 億 5,800 万円と、中期目標の約 292 億円に対し、累計達成率は 47.5%となりました。

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)

再配置区分		施設数	2 着手済	3 課題の 明確化	4 合意	5 事業中	6 完了	R6年度 完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率
存続	存続(長寿命化)	119	12	20	10	9	51	22	102	70
	存続(更新)	3	0	0	1	1	0	0	2	2
	存続(長寿命化・更新なし)	115	6	6	7	11	9	5	39	27
	用途変更	3	0	0	0	0	2	0	2	2
	統合(存続)	25	10	3	1	3	8	2	25	12
	存続施設合計	265	28	29	19	24	70	29	170 (64.2%)	113 (42.6%)
削減	統合(廃止)	44	1	0	5	8	30	7	44	43
	譲渡	118	28	23	12	11	44	8	118	67
	用途廃止(除却)	39	2	7	10	6	14	2	39	30
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	11	0	8	0	0	3	0	11	3
	用途廃止(検討)	57	4	7	14	9	23	5	57	46
	削減対象施設合計	269	35	45	41	34	114	22	269 (100.0%)	189 (70.3%)
総計		534	63	74	60	58	184	51	439 (82.2%)	302 (56.6%)

(表2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)

(単位: m²)

再配置区分		延床面積	2 着手済	3 課題の 明確化	4 合意	5 事業中	6 完了	R6年度 完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率
削減	統合(廃止)	14,495	34	0	9,592	851	4,018	2,677	14,495	14,461
	譲渡	21,076	2,535	5,170	2,631	1,791	8,949	2,109	21,076	13,371
	用途廃止(除却)	15,106	880	3,597	4,455	598	5,576	637	15,106	10,629
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	7,114	0	4,052	0	0	3,062	0	7,114	3,062
	用途廃止(検討)	47,657	1,885	5,206	10,378	5,215	24,973	2,259	47,657	40,566
	削減対象施設合計	105,448	5,334	18,025	27,056	8,455	46,578	7,682	105,448 (100.0%)	82,089 (77.8%)

※表1、表2は後期実施計画の再配置区分に基づく進捗状況のため、完了区分の変更により実績と異なる場合があります。

(表3) 中期目標に対する削減進捗状況表

		H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06
単年度	削減施設数	7	34	19	26	9	14	23	19	18	20
	削減面積(m ²)	3,989	5,246	3,872	2,934	3,882	4,749	3,553	2,455	4,670	7,282
	削減効果額(百万円)	1,383	1,889	1,329	808	1,157	1,470	1,327	761	1,364	2,370
	貸付面積	39	0	400	989	2,786	158	10,437	3,154	4,376	4,537
累計	削減施設数	7	41	60	86	95	109	132	151	169	189
	削減面積(m ²)	3,989	9,235	13,107	16,041	19,923	24,672	28,225	30,680	35,350	42,632
	削減効果額(百万円)	1,383	3,272	4,601	5,409	6,566	8,036	9,363	10,124	11,488	13,858
	貸付面積込み	4,028	9,274	13,546	17,469	24,137	29,044	43,034	48,643	57,689	69,508
達成率	削減面積(目標:101,800m ²)	3.9%	9.1%	12.9%	15.8%	19.6%	24.2%	27.7%	30.1%	34.7%	41.9%
	削減効果額(目標:約292億)	4.7%	11.2%	15.8%	18.5%	22.5%	27.5%	32.1%	34.7%	39.4%	47.5%
	貸付面積込み	4.0%	9.1%	13.3%	17.2%	23.7%	28.5%	42.3%	47.8%	56.7%	68.3%

※除却等、延床面積の削減につながる実績のみ計上しています。


具体的な完了の内容についてはP6に記載しています。

※貸付を行った面積については削減実績に含めていませんが、貸付を行うことで維持管理費の削減等、財政効果が見込めるため、貸付を行った面積を加味した場合についても記載しています。


※計画における施設の進捗評価は、維持管理経費削減等につながる貸付の契約が開始された時点で完了とします。

◆金額は千円未満の端数処理により本表上の計算と合わない場合があります。

(グラフ1)削減面積・削減施設数推移(単年度ごと)

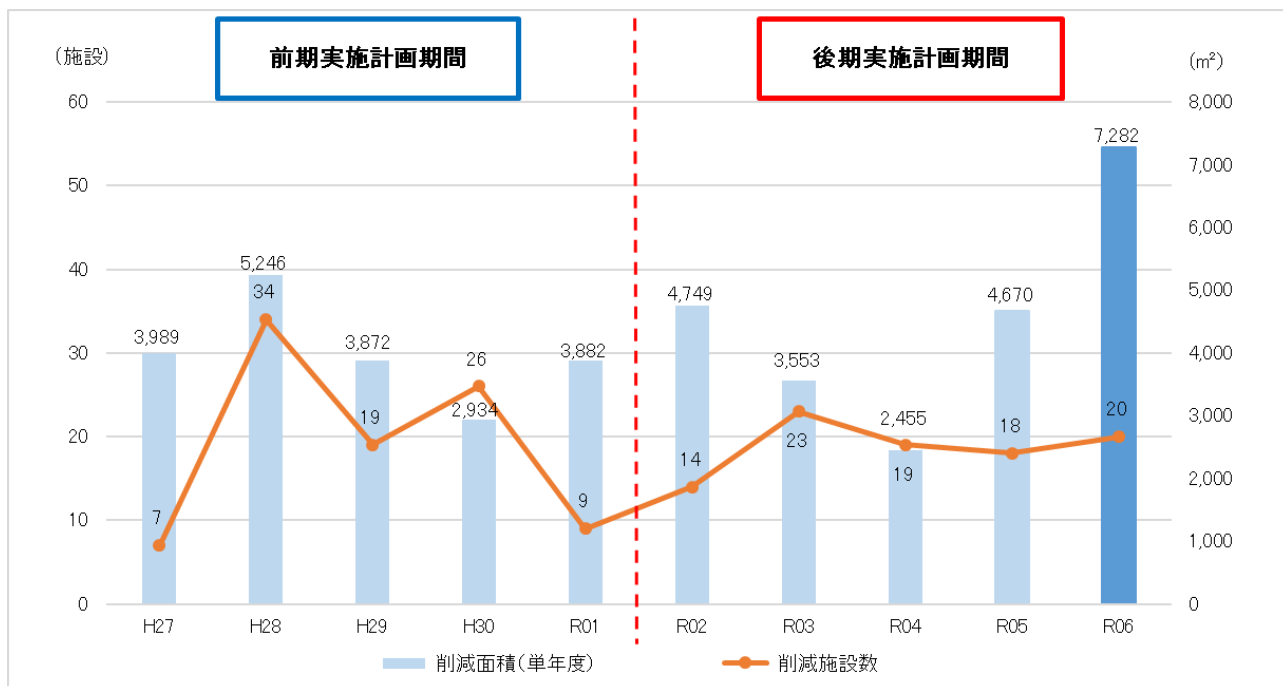

(グラフ 2)到達度の累計推移(削減実績)

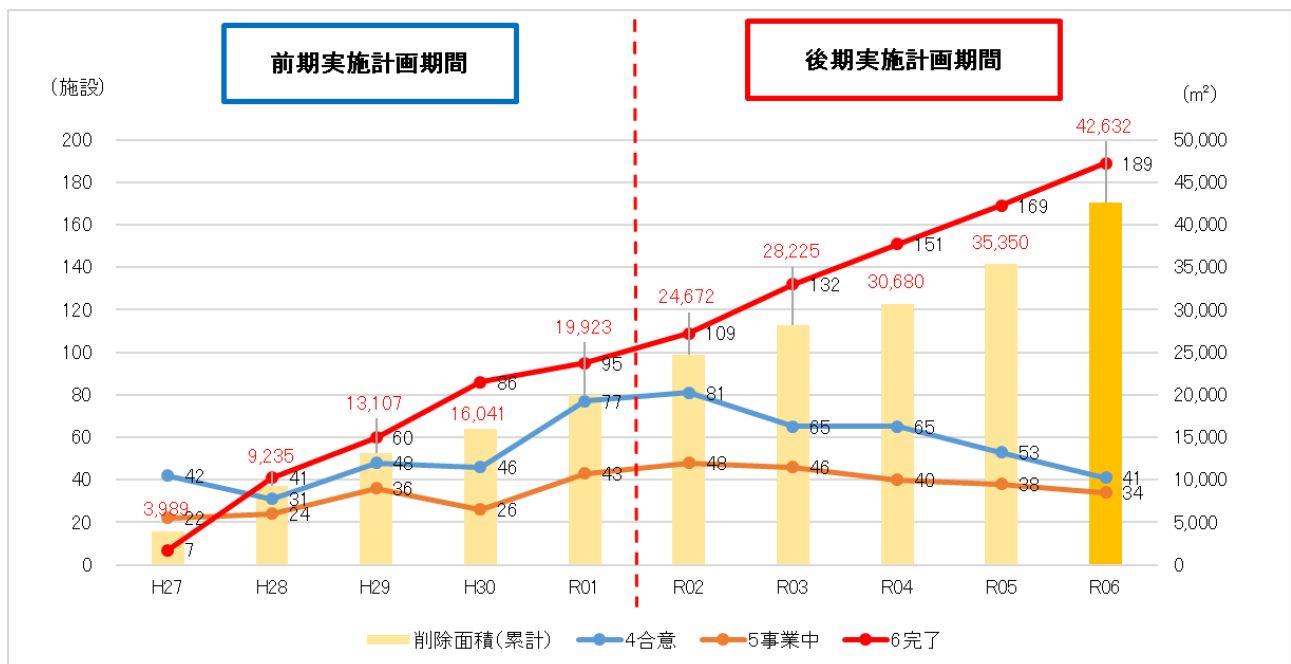

(2) 取組概要

ア 令和6年度における完了分(存続施設 24 施設)

(ア) 長寿命化(22 施設)

小学校等の教育施設は、学校長寿命化計画に基づき外壁改修工事やLED化工事を実施しました。

また、市民会館・地域公民館、消防施設、庁舎ほかの施設についても、後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施しました。

○小学校 7 施設 ○中学校及び小中一貫校 3 施設 ○市民会館・地域公民館 3 施設
○消防施設 2 施設 ○庁舎 1 施設 ○幼稚園 1 施設 ○児童館 1 施設
○保健福祉センター 1 施設 ○産業振興施設 1 施設 ○体育施設 1 施設 ○その他の施設 1 施設

(イ) 更新(1 施設)

放課後児童クラブ教室について、建替え更新を行いました。

○放課後児童クラブ教室 1 施設

(ウ) 用途変更(1 施設)

用途を廃止した集会施設について、公用の書庫として利用しています。

○集会施設 1 施設

イ 令和6年度における完了分(削減施設 27 施設)

(ア) 譲渡(8 施設)

集会施設及び農業施設は、利用者が地域住民又は特定の利用者に限られるため地元や施設利用者へ譲渡しました。

○集会施設 7 施設 ○農業施設 1 施設

(イ) 除却(11 施設)

施設の統廃合で使用しなくなった施設のうち、老朽化等で利用の見込めない施設について除却しました。

○消防施設 4 施設 ○庁舎 3 施設 ○市営住宅 2 施設 ○集会施設 1 施設
○人権ふれあいセンター 1 施設

(ウ) 貸付(7 施設)

廃校となった小学校及び体育館や用途廃止した施設について、民間事業者に貸付を行いました。

○宿泊(研修)施設 3 施設 ○小学校 2 施設 ○集会施設 1 施設 ○体育施設 1 施設

※貸付については、延床面積の削減とならないため P4(表 3)の削減施設数及び面積に含めません。

(エ) 返還(1 施設)

消防施設の再編・統合に伴い、借用していた土地・建物を所有者へ返還しました。

○消防施設 1 施設

ウ 公共施設マネジメント全体の取組

(ア) 令和 6 年度の廃校活用事業『廃校 Re 活用プロジェクト』

本市では、平成 24 年度から令和 2 年度までの 9 年間で 16 校の小学校が閉校したことを受け、地域に再び賑わいを取り戻すべく、廃校活用の取組を積極的に進めてきました。これまでに民間活用や行政利用により 10 校が活用されています。

他の廃校についても活用に向けた取組を行っており、令和 6 年度廃校活用事業として、旧細見小学校、旧美鈴小学校の民間提案制度による事業者募集を行いました。

(イ) 金融機関と連携した未利用公有財産の活用に関する取組

本市では、令和 2 年度に廃校などの大規模遊休資産等の利活用促進に向け、株式会社京都銀行と京都北都信用金庫と公民連携促進に関する連携協定を締結しました。

令和 6 年度は、京都銀行との連携事業として、市内の廃校活用事業者から活用事例を学ぶとともに、未利用公有財産を視察し事業者とのマッチングを図る「公有財産活用フェア&現地見学ツアー」を開催し、京都府内外から事業者が参加しました。また、旧保育園 2 施設の活用アイデアをコンテスト形式で公募する「未利用公有財産活用ビジネスプランコンテスト」を開催し、旧中夜久野保育園は、令和 7 年度から近藤建設工業株式会社によりアクアポニックスガーデンとして活用されることが決定しました。

京都北都信用金庫との連携事業としては、まちなかの未利用公有空間を題材に「こんなふうになったらいいな」を見える化するため、先進事例の講演やワークショップにより、施設や周辺環境の特徴を活かしたビジョンを作成する「まちなかトライアルセミナー&ワークショップ」を開催しました。市内事業者や信金職員のほか市職員も参加し、未利用公有財産の活用について新たな視点と発想を学び、公民連携による利活用意識の醸成を図ることができました。



〈現地見学ツアー〉



〈コンテスト表彰式〉



〈ワークショップ〉

(ウ) 公共施設等包括管理業務委託の導入検討

本市では、公共施設等に関する管理水準の均質化等、施設管理の質の向上を図ることにより、施設利用者の安心・安全と持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目的として、市の保有する複数の施設に係る保守点検業務及び修繕業務等を包括的に委託する公共施設等包括管理業務委託導入の検討を進めてきました。

令和 4 年 3 月から包括民間委託専門部会での検討を始めた福知山市公共施設等包括管理業務は、令和 6 年度に公募型プロポーザル方式による事業者選定を行い、令和 7 年度からの導入に向け施設所管課とともに準備を進めました。

(エ) 本市の公共施設マネジメントの取組に対する評価

全国の市区町村の創意工夫あふれる取組事例を発表、表彰する「行革甲子園 2024」において、「福知山市廃校 Re 活用プロジェクト」が関西初の最優秀賞であるグランプリを受賞しました。行革甲子園は、地方自治体が行き組んできた「行政改革」の取組の発表により、自治体間でアイデアやノウハウを共有し、自らの取組に活用していただくことで、行政改革の更なる推進を図ることを目的に、平成 24 年度から隔年でこれまで 7 回開催されています。今回 35 都道府県 78 市区町村から 97 事例（うち、審査対象事例は 91 事例）の応募があった中、未利用財産の活用促進のため金融機関との協定やバスツアーを行い、平成 24 年度から発生した廃校 16 校のうち 10 校を活用している実績などが評価されました。

また、ファシリティマネジメントに関する優れた業績等を表彰する「第 19 回日本ファシリティマネジメント大賞-JFMA 賞-」において、本市が FM 実践組織として応募した「未来の世代に責任を持つ循環型 FM+PPP」（FM 実践組織：福知山市、サービス提供者：株式会社京都銀行、京都北都信用金庫）が関西の自治体で初となる優秀ファシリティマネジメント賞を受賞しました。日本ファシリティマネジメント大賞は、日本国内における FM の普及・発展に資することを目的に平成 19 年から毎年開催されており、本市の廃校 Re 活用の取組と毎年度進捗状況を公表している点が特に評価されました。



〈行革甲子園 2024 授賞式〉



〈第 19 回 JFMA 賞 授賞式〉

(オ) 第 2 期公共施設マネジメント基本計画及び前期実施計画の策定

令和 6 年度末に「福知山市公共施設マネジメント基本計画（以下、第 1 期基本計画）」及び「福知山市公共施設マネジメント後期実施計画（以下、第 1 期後期実施計画）」が計画期間の終了を迎えることから、これまでの取組の成果、課題及び対応策等を反映した「第 2 期公共施設マネジメント基本計画（R7～R16）（以下、第 2 期基本計画）」及び「第 2 期福知山市公共施設マネジメント前期実施計画（R7～R11）（以下、第 2 期前期実施計画）」を令和 6 年度に策定しました。

(3) 進捗状況に対する評価

ア 存続対象施設への取組

後期実施計画では、総量削減の取組に加えて、存続対象施設の長寿命化や計画的な予防保全の取組を進めることにより、将来の更新費の削減や財政負担の平準化を図っていくこととしています。

令和 6 年度は、令和 3 年 3 月に施設の長寿命化や予防保全について定めた個別施設計画を策定してから約 4 年間で約 64%の施設に着手し、惇明小学校等、教育施設を中心に 22 施設について長寿命化改修工事を実施しました。存続対象施設については、個別施設計画や各関連施設計画に沿って着実に取組が進んでいます。

また、令和 4 年度から検討を進めてきた公共施設等包括管理業務委託について、令和 7 年度から導入開始し、長寿命化に関する取組を進めています。

イ 削減対象施設への取組

令和 6 年度は、削減対象施設のうち、大部分を占めている「譲渡」、「統合（廃止）」、「用途廃止（検討）」の再配置区分となっている施設の取組が進み、全体の再配置完了面積や削減面積に大きく寄与しています。

再配置区分が「譲渡」となっている集会施設については、令和 2 年度以降、新型コロナウイルスの影響もあり、地元との協議を進めることが難しく譲渡が進んでいない状況にありましたが、令和 6 年度には 7 施設の譲渡が完了し、地元との丁寧な協議を進めてきた成果が出ています。

削減対象としている施設については、除却等の協議に全ての施設で着手し、合意形成が図れた施設も 70.3%と着実に進捗しています。

ウ 公民連携の取組

公共施設マネジメント基本計画に基づき、平成 24 年度以降に統廃合を行った全 16 校の廃校のうち、2 校の行政利用、8 校の民間活用、合計 10 校の活用が令和 6 年度までに実現しています。民間活用した廃校については、売却収入、貸付収入、維持管理費等の削減に加え、新たな雇用の創出や施設利用者による賑わい等、地域活性化にもつながっています。

廃校などの大規模遊休資産のほか、旧保育園などの中規模の施設等についても、ビジネスプランコンテストといった新たな取組や民間提案制度により活用に向け検討を進めています。

(4) 今後の取組の進め方について

ア 公共施設マネジメント基本計画及び後期実施計画の終了・第 2 期の取組について

平成 27 年度より計画期間 10 年間とした第 1 期基本計画及び、令和 2 年度より計画期間 5 年間とした第 1 期後期実施計画が令和 6 年度末をもって計画期間の満了を迎えました。そこで、第 1 期基本計画期間における進捗評価を踏まえた課題、今後の対応、方向・方策について実績報告書等において検討・整理を行い、一層の公共施設マネジメントの推進につなげます。

令和 6 年度に策定した第 2 期基本計画及び第 2 期前期実施計画においては、第 1 期に引き続き、公共施設の総量削減に取り組みつつ、民間活用の効果や脱炭素の取組についても新たな目標とし、公共施設の適正な再配置を進めていきます。

イ 存続対象施設について

本市では、実施計画において公共施設の再配置とともに、「持続可能」・「全体最適」の観点から存続する施設の大規模な改修や建替え・長寿命化の必要性について整理し、令和 3 年 3 月に施設の長寿命化や予防保全について定めた個別施設計画を策定しました。令和 7 年 3 月に新たに策定した第 2 期前期実施計画で示した再配置方針に基づき、施設の長寿命化や予防保全について定めた個別施設計画を令和 7 年度に改訂し、存続する施設の長寿命化等を図りながら市民が必要とする施設やサービスの維持に努めていきます。

また、個別施設計画の実効性を高めるため、令和 7 年度から公共施設等包括管理業務を導入し、存続する施設について計画的な予防保全を実施することにより、施設の長寿命化を図ります。

4 用途大分類 年度別進捗状況

◆金額は千円未満の端数処理により本表上の計算と合わない場合があります。

(1) 公用施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	1	1	1	1	
		2 着手済	0	1	1	0	0	
		3 課題の明確化	1	0	0	1	0	
		4 合意	5	4	3	4	0	
		5 事業中	0	3	4	5	4	
		6 完了(当該年度)	0	0	3	2	6	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	3	5	
		合計	7	9	12	16	16	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事について完了した。 三和支所、消防防災センター、福知山消防署北分署 【除却】用途廃止した施設を除却した。 資材置場、旧総合センター、上夜久野分団第2部(山中)本部							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●消防施設(4 施設) 細見分団第1部(芦刈)、細見分団第2部(寺尾・草山)、細見分団第3部(千束・梅原)本部 細見分団第4部(辻)						
	6 完了	●庁舎(3 施設) 三和支所、資材置場、旧総合センター ●消防施設(3 施設) 消防防災センター、上夜久野分団第2部(山中)本部、福知山消防署北分署						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	5	2	0	0	0	
		2 着手済	5	7	1	1	1	
		3 課題の明確化	1	2	1	1	1	
		4 合意	15	7	11	4	1	
		5 事業中	9	7	6	8	6	
		6 完了(当該年度)	9	10	6	5	5	
		6 完了(昨年度まで)	0	9	19	25	30	
		合計	44	44	44	44	44	
	完了	年度削減面積	484	386	230	211	741	
		累計削減面積	484	870	1,100	1,311	2,052	
		更新費削減額	192	133	78	44	278	
		累計更新費削減額	192	324	402	445	724	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,399	1,399	2,318	2,318	2,318		
	累計更新費削減額	479	479	802	802	802		
具体的な取組								
【除却】用途廃止した施設を除却した。 埋蔵文化財収蔵庫、上夜久野分団第3部(田谷垣)、河守上分団第2部(二俣)本部 河守上分団第3部(天田内) 【返還】消防施設の再編・統合に伴い、借用していた土地・建物を所有者へ返還した。 河守上分団第1部(佛性寺・内宮)								
取組状況の内訳 (R6年度)								
4 合意		●消防施設(1 施設) 下六長田北消防器具庫						
5 事業中		●消防施設(6 施設) 上夜久野分団第1部(門垣・副谷)、上夜久野分団第3部(中田) 上六分団第3部(池田)、河守分団第1部(新町・清水)、河守分団第2部(中央・関・下町)本部 河守水防倉庫						
6 完了		●庁舎(1 施設) 埋蔵文化財収蔵庫 ●消防施設(4 施設) 上夜久野分団第3部(田谷垣)、河守上分団第1部(佛性寺・内宮) 河守上分団第2部(二俣)本部、河守上分団第3部(天田内)						
備考								

(2) 教育施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	25	24	0	0	0	
		3 課題の明確化	6	4	18	18	16	
		4 合意	10	10	13	8	3	
		5 事業中	2	3	4	3	0	
		6 完了(当該年度)	0	2	6	6	10	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	8	14	
		合計	43	43	43	43	43	
具体的な取組	【長寿命化】学校長寿命化計画等に基づき、後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 惇明小学校、修斉小学校:屋上防水改修工事 六人部小学校、三和中学校:便所改修工事 南陵中学校、桃映中学校:外壁改修工事 六人部小学校体育館、上川口小学校体育館、雀部小学校体育館、成仁小学校体育館:LED 化工事							
	取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●小学校(2 施設) 昭和小学校、上豊富小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(1 施設) 大江中学校					
5 事業中		該当なし						
6 完了		●小学校(7 施設) 惇明小学校、修斉小学校、六人部小学校、六人部小学校体育館、上川口小学校体育館 雀部小学校体育館、成仁小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(3 施設) 南陵中学校、桃映中学校、三和中学校						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	2	2	0	0	0		
		2 着手済	0	0	1	0	0		
		3 課題の明確化	9	1	0	1	0		
		4 合意	16	14	14	11	12		
		5 事業中	1	3	1	3	1		
		6 完了(当該年度)	4	8	4	1	2		
		6 完了(昨年度まで)	0	4	12	16	17		
		合計	32	32	32	32	32		
	完了	年度削減面積	2,435	0	0	362	0		
		累計削減面積	2,435	2,435	2,435	2,797	2,797		
		更新費削減額	769	0	0	119	0		
		累計更新費削減額	769	769	769	889	889		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	25,811	29,049	23,027	23,027	21,233		
		累計更新費削減額	5,979	6,571	7,209	7,209	6,358		
具体的な取組									
【貸付】活用事業者を募集し、民間事業者に貸付を行った。 有仁小学校、有仁小学校体育館									
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●小学校(12 施設) 旧天津小学校、旧上六人部小学校、旧上六人部小学校体育館、旧金谷小学校、旧精華小学校 美河小学校、美河小学校体育館、美鈴小学校、美鈴小学校体育館、旧金谷小学校体育館 旧明正小学校、旧三岳小学校体育館							
	5 事業中	●学校給食センター(1 施設) 旧夜久野学校給食センター							
	6 完了	●小学校(2 施設) 有仁小学校、有仁小学校体育館							
備考									

(3) 公営住宅

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	1	2	1	1	
		2 着手済	5	4	4	5	5	
		3 課題の明確化	2	2	2	2	2	
		4 合意	9	7	6	6	6	
		5 事業中	0	3	4	4	3	
		6 完了(当該年度)	1	0	0	1	1	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	1	2	
		合計	18	18	19	20	20	
具体的な取組	【除却】つつじが丘の集約化に伴い既存施設の除却を行った。 つつじが丘団地							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●市営住宅(6 施設) 宮ノ下団地、岡ノ三団地、広峯団地、南岡団地、矢見所団地、南佳屋野団地						
	5 事業中	●市営住宅(2 施設) 東堀団地、旭が丘団地 ●その他住宅(1 施設) 鬼の里 U ターン広場1						
	6 完了	●市営住宅(1 施設) つつじが丘団地						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	14	11	0	0	0		
		2 着手済	4	7	12	5	5		
		3 課題の明確化	0	0	5	9	9		
		4 合意	2	1	2	4	1		
		5 事業中	1	1	0	1	3		
		6 完了(当該年度)	0	1	1	0	1		
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	2	2		
		合計	21	21	21	21	21		
	完了	年度削減面積	0	103	65	0	31		
		累計削減面積	0	103	168	168	199		
		更新費削減額	0	29	11	0	9		
		累計更新費削減額	0	29	40	40	49		
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,091	3,091	5,361	5,476	5,476			
	累計更新費削減額	448	448	833	866	866			
具体的な取組	【除却】用途廃止した施設を除却した。 三和菟原下団地								
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●市営住宅(1 施設) 向野団地							
	5 事業中	●その他住宅(3 施設) 小田市営一戸建住宅、三和町市営一戸建住宅(細見)、鬼の里Uターン広場2							
	6 完了	●市営住宅(1 施設) 三和菟原下団地							
備考									

(4) 市民文化系施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	23	22	7	6	5	
		2 着手済	5	6	14	13	14	
		3 課題の明確化	2	1	4	4	4	
		4 合意	4	4	4	3	1	
		5 事業中	0	1	4	6	4	
		6 完了(当該年度)	1	0	2	1	4	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	3	4	
		合計	35	35	36	36	36	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた予定していた改修工事を実施した。 六人部地域公民館:大規模改修工事 市民交流プラザふくちやま(中央公民館・図書館中央館):LED 化工事 大江町過疎地域総合センター:空調設備更新工事 【除却】つつじが丘の集約化に伴い既存施設の除却を行った。 つつじが丘集会所							
	取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●市民会館・地域公民館(1 施設) 厚生会館					
5 事業中		●集会施設(1 施設) 東堀集会所 ●市民会館・地域公民館(2 施設) 成和地域公民館(豊富農村環境改善センター)、川口地域公民館 ●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンター 下六人部会館						
6 完了		●集会施設(1 施設) つつじが丘集会所 ●市民会館・地域公民館(3 施設) 六人部地域公民館、市民交流プラザふくちやま(中央公民館・図書館中央館) 大江町過疎地域総合センター						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0		
		2 着手済	7	6	5	5	5		
		3 課題の明確化	17	14	13	10	7		
		4 合意	30	26	21	18	14		
		5 事業中	25	25	23	18	15		
		6 完了(当該年度)	3	9	10	11	10		
		6 完了(昨年度まで)	0	3	12	22	33		
		合計	84	84	84	84	84		
	完了	年度削減面積	827	1,393	1,778	1,938	2,109		
		累計削減面積	827	2,220	3,998	5,936	8,045		
		更新費削減額	331	438	493	603	763		
累計更新費削減額		331	769	1,262	1,865	2,628			
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	11,943	12,670	13,683	14,107	14,904			
	累計更新費削減額	3,964	4,186	4,540	4,683	4,968			
具体的な取組	【譲渡】集会施設を地元に譲渡した。 内田町・岡ノ一町けやき集会所、昭和集会所、堀センター、観音寺公会堂、桔梗が丘集会所 中夜久野集会所、定住促進センター庵我会館 【除却】消防施設の再編・統合に伴い施設の除却を行った。 人権ふれあいセンターさわやか館 【貸付】活用事業者を募集し、民間事業者に貸付を行った。 俊明多目的集会所 【用途変更】用途廃止した集会施設について、公用の書庫として利用を開始した。 多目的集会施設金山会館								
	取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●集会施設(14 施設) 惇明中央集会所、南羽合集会所、長田北集会所(公民館)、中佐々木公民館 惇明西集会所、本町集会所、農村婦人の家上豊富会館、喜多公民館、後野集会所 多目的集会施設金谷会館、金屋共同集会所、夜久野畑集落センター 多目的集会施設上夜久野構造改善会館、有路下多目的集会所						
		5 事業中	●集会施設(15 施設) 一ノ宮教育集会所、室集会所、長田南公民館、大野公民館、一ノ宮集会所、鴨野町集会所 土師宮町公会堂、舟越会館、多目的集会施設三岳会館、構造改善センター戸田会館 一ノ宮老人施設、小谷ヶ丘公民館、新庄集会所、千原共同集会所 多目的集会施設下川口会館						
		6 完了	●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンターさわやか館 ●集会施設(9 施設) 内田町・岡ノ一町けやき集会所、昭和集会所、堀センター、観音寺公会堂、桔梗が丘集会所 中夜久野集会所、俊明多目的集会所、定住促進センター庵我会館、多目的集会施設金山会館						
	備考								

(5) 医療施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	1	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	1	0	1	1	
		5 事業中	0	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	1	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	1	1	
		合計	1	1	2	2	2	
具体的な取組	川合診療所について、地元から譲渡の要望を受け、市としての方向性を確認した。							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●診療施設(1 施設) 川合診療所						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	1	1	1	1	
		5 事業中	2	2	2	2	2	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	3	3	3	3	3	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	282	282	282	282	282	
累計更新費削減額		102	102	102	102	102		
具体的な取組	三岳診療所について、解体にかかる設計業務を実施した。							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 国民健康保険 金谷診療所						
	5 事業中	●診療施設(2 施設) 三岳診療所、三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)						
	6 完了	該当なし						
備考								

(6) 子育て支援施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0	
		2 着手済	3	3	3	3	3	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	10	5	4	
		5 事業中	1	1	1	4	2	
		6 完了(当該年度)	1	1	1	2	3	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	3	5	
		合計	6	6	17	17	17	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 成仁幼稚園:園舎防水改修工事 下六人部児童センター:LED 化、雨漏り改修工事 【更新】放課後児童クラブ教室の建替え更新を実施した。 大正放課後児童クラブ							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●児童館(4 施設) 庵我児童館、南佳屋野児童館、前田児童館、南有路児童館						
	5 事業中	●児童館(1 施設) 丘児童センター ●放課後児童クラブ教室(1 施設) 遷喬放課後児童クラブ						
	6 完了	●幼稚園(1 施設) 成仁幼稚園 ●児童館(1 施設) 下六人部児童センター ●放課後児童クラブ教室(1 施設) 大正放課後児童クラブ						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	3	3	0	0	0		
		2 着手済	1	1	3	3	3		
		3 課題の明確化	1	1	2	2	2		
		4 合意	5	5	5	5	3		
		5 事業中	1	0	0	0	2		
		6 完了(当該年度)	0	1	0	0	0		
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	1	1		
		合計	11	11	11	11	11		
	完了	年度削減面積	0	1,031	0	0	0		
		累計削減面積	0	1,031	1,031	1,031	1,031		
		更新費削減額	0	325	0	0	0		
		累計更新費削減額	0	325	325	325	325		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,381	3,381	3,381	3,381	3,381		
		累計更新費削減額	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002		
具体的な取組	川合保育園、中夜久野保育園について、未利用公有財産活用ビジネスプランコンテストの取組により活用事業者の募集を行った。								
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●保育所(3 施設) 菟原保育園、上夜久野保育園、旧有路保育園							
	5 事業中	●保育所(2 施設) 川合保育園、中夜久野保育園							
	6 完了	該当なし							
備考									

(7) 保健・福祉施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	0	1	0	
		5 事業中	0	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	1	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	0	0	0	1	1	
具体的な取組	【長寿命化】空調設備改修及びLED 化工事を実施した。 北部保健福祉センター							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	該当なし						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	●保健福祉センター(1 施設) 北部保健福祉センター						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	1	1	1	1	1	
		3 課題の明確化	3	3	3	3	2	
		4 合意	0	0	0	0	0	
		5 事業中	2	0	0	0	1	
		6 完了(当該年度)	0	2	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	2	2	
		合計	6	6	6	6	6	
	完了	年度削減面積	0	640	0	0	0	
		累計削減面積	0	640	640	640	640	
		更新費削減額	0	403	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	403	403	403	403	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	640	640	640	640	836	
		累計更新費削減額	403	403	403	403	442	
具体的な取組	高齢者生産活動センターについて、利活用の検討を行っている。							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●その他の社会福祉施設(1 施設) 高齢者生産活動センター						
	6 完了	該当なし						
備考								

(8) 産業系施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0	
		2 着手済	0	0	3	2	1	
		3 課題の明確化	1	1	2	2	3	
		4 合意	1	1	1	2	1	
		5 事業中	0	1	2	2	2	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	1	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	4	4	8	8	8	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた焼却設備等改修工事が完了した。 中丹地域有害鳥獣処理施設							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●産業振興施設(1 施設) 食肉センター						
	5 事業中	●産業振興施設(2 施設) 研磨工業所、福知山鉱山坑廃水処理場						
	6 完了	●産業振興施設(1 施設) 中丹地域有害鳥獣処理施設						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	23	23	17	17	17	
		3 課題の明確化	7	7	13	13	13	
		4 合意	7	5	5	5	5	
		5 事業中	2	4	4	3	2	
		6 完了(当該年度)	1	0	0	1	1	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	1	2	
		合計	40	40	40	40	40	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	181	
		累計削減面積	0	0	0	0	181	
		更新費削減額	0	0	0	0	109	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	109	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	4,882	4,882	4,882	656	656	
		累計更新費削減額	2,311	2,311	2,311	276	276	
具体的な取組	【譲渡】共同農作業所を自治会へ譲渡した。 下猪崎共同農作業所							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●農業施設(共同作業所)(5 施設) 新庄農作業所、新庄農機具保管庫⑥・⑦、新庄農機具保管庫⑨、石本農作業所 後野農機具保管庫						
	5 事業中	●農業施設(共同作業所)(2 施設) 下猪崎共同作業所、新町農業作業所						
	6 完了	●農業施設(共同作業所)(1 施設) 下猪崎共同農作業所						
備考								

(9) 観光・宿泊(研修)施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	2	3	0	0	0	
		4 合意	0	0	2	0	0	
		5 事業中	0	0	2	2	2	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	2	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	2	
		合計	3	3	4	4	4	
具体的な取組	三和荘について、令和４年度から市が直接管理しており、必要な施設改修を実施している。							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●宿泊(研修施設)(2 施設) 三和荘、大江山グリーンロッジ						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	13	11	11	11	10	
		4 合意	2	3	3	2	1	
		5 事業中	1	1	1	2	1	
		6 完了(当該年度)	1	1	0	0	3	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	2	2	
		合計	17	17	17	17	17	
	完了	年度削減面積	1,003	0	0	0	0	
		累計削減面積	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
		更新費削減額	178	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	178	178	178	178	178	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,359	2,395	2,395	2,395	1,286	
		累計更新費削減額	484	497	497	497	238	
具体的な取組	【貸付】民間事業者に貸付を行った。 体験実習館(童子荘他)、旧三岳青少年山の家、森林総合利用施設(第2キャンプ場)							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●観光施設(1 施設) 野鳥の森管理棟						
	5 事業中	●宿泊(研修施設)(1 施設) 夜久野町緑の里交流センター						
	6 完了	●宿泊(研修施設)(2 施設) 体験実習館(童子荘他)、旧三岳青少年山の家、森林総合利用施設(第2キャンプ場)						
備考								

(10) 生涯学習系施設

再配置区分			存続施設				(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	7	7	3	3	1
		2 着手済	2	2	2	3	5
		3 課題の明確化	11	10	5	4	4
		4 合意	8	7	9	5	3
		5 事業中	0	2	7	6	7
		6 完了(当該年度)	0	0	2	6	2
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	2	8
		合計	28	28	28	29	30
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた大規模改修工事を実施した。 六人部地域体育館 【貸付】民間事業者に貸付を行った。 林間広場						
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	●博物館(1 施設) ファームガーデンやくの 林産物展示販売用施設(やくの木と漆の館) ●体育施設(体育館)(1 施設) 福知山市武道館 ●体育施設(運動場)(1 施設) 三段池公園テニスコート					
	5 事業中	●博物館(1 施設) 児童科学館 ●体育施設(体育館)(3 施設) 三段池公園総合体育館、成和地域体育館、川口地域体育館 ●体育施設(運動場)(2 施設) 市民運動場、三和町川合運動広場 ●体育施設(プール)(1 施設) 温水プール					
	6 完了	●体育施設(体育館)(1 施設) 六人部地域体育館 ●体育施設(運動場)(1 施設) 林間広場					
備考							

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	3	2	0	0	0	
		2 着手済	1	1	3	3	3	
		3 課題の明確化	2	2	1	1	1	
		4 合意	3	3	3	3	3	
		5 事業中	1	2	2	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	1	2	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	1	3	
		合計	10	10	10	10	10	
	完了	年度削減面積	0	0	0	2,159	0	
		累計削減面積	0	0	0	2,159	2,159	
		更新費削減額	0	0	0	598	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	598	598	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,003	1,377	3,162	3,162	3,162		
	累計更新費削減額	395	530	993	993	993		
具体的な取組	夜久野町太鼓練習場、夜久野町教育文化会館について、再配置を検討している。							
取組状況の内訳 (R6年度)	4 合意	●体育施設(プール)(1 施設) 三和町鹿倉運動公園プール ●その他施設(2 施設) 夜久野町太鼓練習場、夜久野町教育文化会館						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

(11) その他

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	0	0	0	0	
		5 事業中	0	1	1	1	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	1	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	1	1	1	1	1	
具体的な取り組み	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた火葬炉等の大規模改修について完了した。 斎場							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	該当なし						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	●その他の施設(1 施設) 斎場						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	0	0	0	
		5 事業中	1	1	1	1	1	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	1	1	1	1	1	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	84	84	84	84	84	
		累計更新費削減額	17	17	17	17	17	
具体的な取組	教員住宅の今後の方向性について、検討を行っている。							
取組状況の内訳（R6年度）	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●職員公舎(1 施設) 教員住宅(上川合)						
	6 完了	該当なし						
備考								
