

**福知山市公共施設マネジメント
令和2年度実施計画進捗状況報告書**



福知山市公共施設マネジメント推進本部

目次

1 進捗状況報告の目的.....	1
2 到達度評価.....	1
(1) 検証の対象.....	1
(2) 到達度の区分.....	1
(3) 後期実施計画の対象施設数について.....	2
3 令和2年度実施計画進捗状況のまとめ.....	3
(1) 進捗概要.....	3
(2) 今年度の取組み概要.....	5
(3) 進捗状況に対する評価.....	8
(4) 今後の取組みの進め方について.....	9
4 用途大分類 年度別進捗状況.....	10
(1) 公用施設.....	11
(2) 教育施設.....	13
(3) 公営住宅.....	15
(4) 市民文化系施設.....	17
(5) 医療施設.....	19
(6) 子育て支援施設.....	21
(7) 保健・福祉施設.....	23
(8) 産業系施設.....	25
(9) 観光・宿泊(研修)施設.....	27
(10) 生涯学習系施設.....	29
(11) その他.....	31

1 進捗状況報告の目的

福知山市の公共施設マネジメントは、平成26年度に策定した「基本方針」及び「基本計画」を着実に推進するため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定めた「実施計画」を5年ごとに策定し、計画を進めています。

「前期実施計画（H27～R1）」の実績や課題を踏まえて、令和2年7月に「後期実施計画（R2～R6）」を策定し、再配置方針を整理しました。

また、新たな取組みとして、後期実施計画で定めた再配置区分に基づき、令和3年3月に「個別施設計画（R3～R12）」を策定し、個々の公共施設の長寿命化等に向けた取組みやその効果についてとりまとめました。

本報告書では、前期実施計画から取組みを進めている公共施設の総量削減に加え、新たに存続する施設の長寿命化や用途廃止を行い遊休資産となった施設の利活用など、総コスト削減につながる取組みについても進捗管理を行い、公共施設マネジメント全体の進捗状況として評価・検証することで、市民の皆様にご理解をいただくとを目的とします。

2 到達度評価

(1) 検証の対象

到達度検証の対象は、後期実施計画で定められた再配置区分の全て（「存続（長寿命化）」「存続（更新）」「用途変更」「統合」「譲渡」「用途廃止」）を対象として、到達度を検証・把握します。

前期実施計画では、削減する施設を中心に進捗管理を行っていましたが、計画的な長寿命化対策等により施設を安全かつ良好な状態に保つため、後期実施計画では、新たに存続する施設についても進捗管理を行うこととしました。

ただし、再配置区分が「存続（長寿命化・更新なし）」の施設は、後期実施計画期間中に具体的な取組みが実施されないため原則対象外とし、必要に応じて到達度を検証します。

(2) 到達度の区分

到達度については、対象施設の再配置区分により①「存続施設（長寿命化等の対策を行う施設）」と②「削減対象施設（譲渡や除却等を行う施設）」の2つに分類し、整理します。

到達度は、1 未着手、2 着手済、3 課題の明確化、4 合意、5 事業中、6 完了の6段階に区分して公共施設マネジメントの進捗状況を把握します。

6段階に区分することにより、それぞれの段階で生じる課題に対して適切な推進策を講じることが可能となります。

特に「4 合意」の段階については、利用者等との間で再配置（存続、削減）に関する諸課題解決の方向性について、具体的な事業実施に関する合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階としています。

① 存続施設(長寿命化等の対策を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	長寿命化等の計画について関係者との協議が未着手
2 着手済	具体的な対策内容や時期について関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	必要な対策や時期が関係者との間で明確に共有されたうえで、事業化に向けて協議している段階
4 合意	必要な対策の内容や時期について庁内調整が整い、後期計画期間中を目安に事業化の合意形成が図れた段階
5 事業中	施設を長く使用するために、建物や設備の耐久性が高まる長寿命化等に関する以下の大規模改修の設計・工事に着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・外壁（外断熱工事、塗装工事など） ・屋上防水（シート防水、屋上断熱など） ・給排水管更新（高架水槽の更新を含む） ・用途変更に伴う間取り、構造変更等の大規模改修
6 完了	工事の完了

※存続施設に関しては、後期実施計画(5年間)に実施する対策について進捗を管理します。

※再配置区分が存続（長寿命化・更新なし）の施設であっても、改修を実施する場合は進捗を管理します。

② 削減対象施設(譲渡や除却等を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	関係者との協議が未着手で内部検討の段階
2 着手済	関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議している段階
4 合意	課題解決に向けて、具体的な事業実施に関する合意形成が図れた段階
5 事業中	登記上の整理や法的に必要な手続きに着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・土地の測量、分筆 ・不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・家屋譲渡等届出書（庁内） ・条例改正 等
	譲渡のための機能補修や除却にかかる設計・工事に着手している段階
6 完了	手続き及び工事の完了、施設の引渡

※削減対象施設に関しては、対象となっているすべての施設について進捗を管理します。

(3) 後期実施計画の対象施設数について

公共施設マネジメントの対象施設は、基本計画策定時点で 734 施設 459,502 m²でした。

実施計画では、公園（106 施設 3,169 m²）やバス待合所、トイレなど比較的小規模な施設（40 施設 2,926 m²）は修繕等の費用が比較的安価であるため、進捗管理の対象施設から除外し、前期実施計画期間中には、95 施設 19,923 m²を削減しています。

また、施設の数え方を原則複数の棟をまとめて1施設とする施設単位とし、複合施設は同一建物でも機能が異なる場合は複数施設とする機能単位としていましたが、長寿命化計画を策定するにあたり、施設の機能や構造、耐用年数により一部施設数を変更したことなどにより、後期実施計画は、対象施設を 534 施設 429,281 m²として取組みをスタートしています。

3 令和2年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 対象施設にかかる到達度別の進捗状況

(表1) 到達度進捗状況表では、公共施設マネジメント後期実施計画の再配置区分に基づき、令和2年度の進捗状況について、施設数で取りまとめています。

令和2年度は、「存続(長寿命化)」の施設が2施設、「統合(存続)」の施設が1施設、存続施設の合計3施設の再配置が完了しました。削減対象施設では、「統合(廃止)」の施設が5施設、「譲渡」の施設が3施設、「用途廃止(除却)」の施設が5施設、「用途廃止(検討)」の施設が3施設の合計16施設が完了となっています。全体としては、534施設のうち19施設の再配置が完了しています。

再配置区分別では、存続施設となっている265施設のうち110施設について長寿命化等の協議に着手し、着手率は41.5%となっています。長寿命化等の対策の実施に合意ができている施設数は45施設となっており、合意率は17.0%となっています。

削減対象施設では、269施設のうち240施設について譲渡や除却等の協議に着手し、着手率は89.2%となっています。また、譲渡や除却等の実施に合意ができている施設数は145施設であり、合意率は53.9%となっています。

全体では、534施設のうち350施設について関係者等との協議に着手し、着手率は65.5%となっており、再配置について関係者等との合意ができている施設数は、190施設となっており、合意率は35.6%となっています。

イ 削減面積の進捗状況

(表2) 削減面積進捗状況表では、令和2年度の進捗状況を延床面積で取りまとめています。

令和2年度の削減実績面積は、4,749㎡でした。

再配置区分別では、「用途廃止(除却)」の施設の削減面積が1,994㎡、「用途廃止(検討)」の施設が売却に繋がったため削減面積は2,435㎡となり、全体の削減面積に大きく寄与しています。

削減対象面積のうち94,918㎡に着手し、着手率は90.0%となっています。また、57,394㎡について合意済みであり、合意率は54.4%となっています。

「用途廃止(検討)」の施設の面積が大部分を占めていることから、今後も公共施設マネジメント全体を推進するためには、「用途廃止(検討)」となっている施設の利活用等について検討を進め、事業化につなげることが重要となります。

ウ 中期目標に対する進捗状況(削減面積・削減効果額)

(表3) 中期目標に対する進捗状況表では、基本計画の中期目標に対する令和2年度の削減実績と削減効果額の進捗状況を取りまとめています。

令和2年度は再配置が完了した削減対象施設16施設のうち、14施設4,749㎡が譲渡、除却、売却などの削減につながりました。令和2年度までの累計削減実績は109施設24,672㎡となり、基本計画で設定した中期目標の101,800㎡に対し達成率は24.2%となりました。

削減効果額は、令和2年度では14億7,000万円となり、令和2年度までの累計では80億3,600万円と、中期目標の292億円に対し、累計達成率は27.5%となりました。

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)

再配置区分	施設数	2	3	4	5	6	着手済計 (2~6) ※0は着手率	合意済計 (4~6) ※0は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了			
存続	存続(長寿命化)	119	31	18	31	1	2	83	34
	存続(更新)	3	0	1	0	0	0	1	0
	存続(長寿命化・更新なし)	115	3	5	4	0	0	12	4
	用途変更	3	0	0	0	2	0	2	2
	統合(存続)	25	6	1	4	0	1	12	5
	存続施設合計	265	40	25	39	3	3	110 (41.5%)	45 (17.0%)
削減	統合(廃止)	44	4	6	14	10	5	39	29
	譲渡	118	35	23	23	27	3	111	53
	用途廃止(除却)	39	3	5	13	5	5	31	23
	用途廃止(売却)								
	用途廃止(貸付)	11	0	8	0	2	0	10	2
	用途廃止(検討)	57	0	11	31	4	3	49	38
	削減対象施設合計	269	42	53	81	48	16	240 (89.2%)	145 (53.9%)
総計	534	82	78	120	51	19	350 (65.5%)	190 (35.6%)	

(表2) 削減面積進捗状況表(延床面積)

再配置区分	延床面積	2	3	4	5	6	着手済計 (2~6) ※0は着手率	合意済計 (4~6) ※0は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了			
削減	統合(廃止)	14,495	133	9,030	4,034	963	121	14,281	5,118
	譲渡	21,076	3,891	6,465	4,796	4,858	199	20,209	9,853
	用途廃止(除却)	15,106	1,486	5,559	906	2,172	1,994	12,117	5,072
	用途廃止(売却)								
	用途廃止(貸付)	7,114	0	3,876	0	2,786	0	6,662	2,786
	用途廃止(検討)	47,657	0	7,084	30,370	1,760	2,435	41,649	34,565
	削減対象施設合計	105,448	5,510	32,014	40,106	12,539	4,749	94,918 (90.0%)	57,394 (54.4%)

(表3) 中期目標に対する進捗状況表


		H27	H28	H29	H30	R01	R02
単年度	削減施設数	7	34	19	26	9	14
	削減面積	3,989	5,246	3,872	2,934	3,882	4,749
	削減効果額(百万円)	1,383	1,889	1,329	808	1,157	1,470
累計	削減施設数(施設)	7	41	60	86	95	109
	削減面積(m ²)	3,989	9,235	13,107	16,041	19,923	24,672
	削減効果額(百万円)	1,383	3,272	4,601	5,409	6,566	8,036
達成率	削減面積 ※目標:101,800m ²	3.9%	9.1%	12.9%	15.8%	19.6%	24.2%
	削減効果額 ※目標:約292億	4.7%	11.2%	15.8%	18.5%	22.5%	27.5%

※譲渡、除却、売却など延床面積の削減につながる実績のみ計上しています。


このため、(表1)の削減対象施設合計に含まれる用途変更及び貸付による2施設を除いています。

具体的な完了の内容についてはP5、P6に記載しています。

(グラフ1)削減面積・削減施設数推移(単年度ごと)

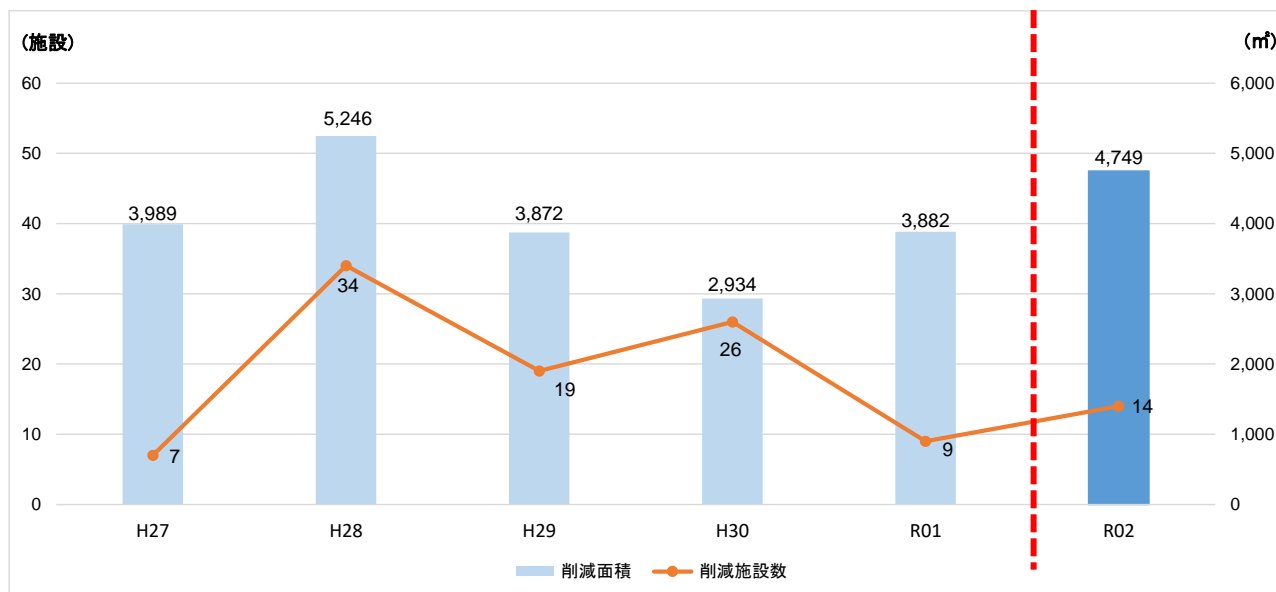

(グラフ2)到達度の累計推移(削減対象施設)

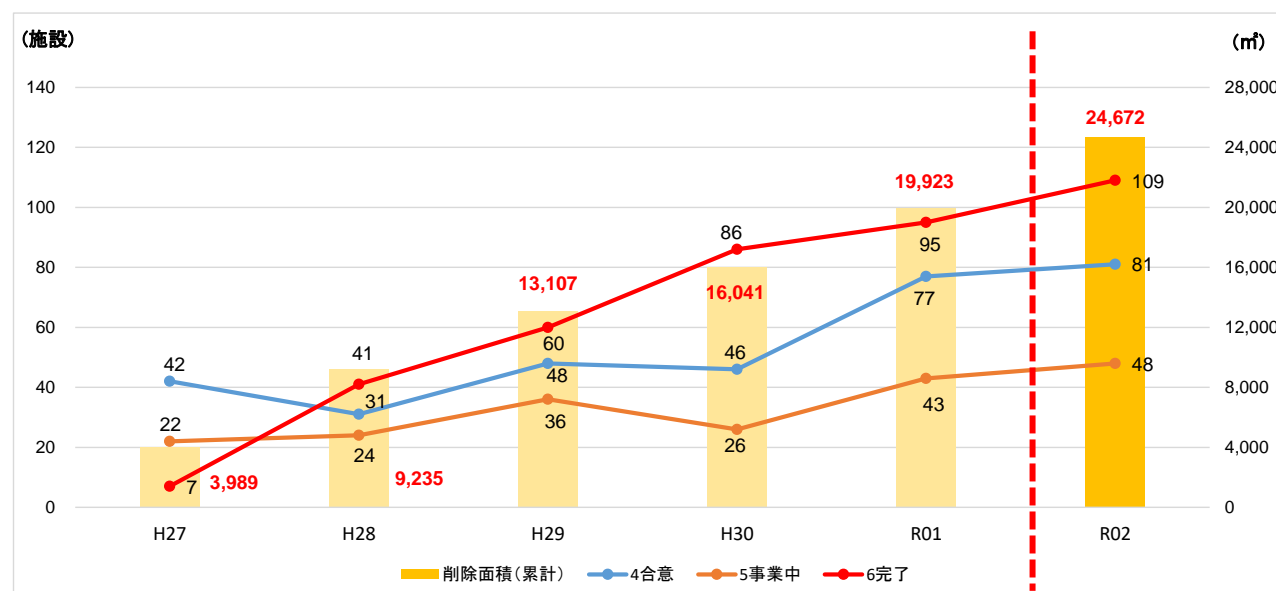

(2) 今年度の取組み概要

ア 令和2年度における完了分(存続施設 3 施設)

(ア) 長寿命化 (2 施設)

市営住宅は、施設の長寿命化を図るため給排水設備（バルク貯水槽）の更新を行いました。また、保育所は、こども園化に向けて大規模改修を実施しました。

○市営住宅 1 施設 ○保育所 1 施設

(イ) 統合・複合化 (1 施設)

集会施設は、2 階部分に介護職員実務者研修施設機能を移転し、有効活用することで複合化を図りました。

○集会施設 1 施設

イ 令和2年度における完了分(削減対象施設 16 施設)

(ア) 譲渡 (1 施設)

集会施設は、利用者が地域住民又は特定の利用者に限られるため、地元へ譲渡しました。

○集会施設 1 施設

(イ) 除却 (8 施設)

設置時の目的が達成された施設を除却しました。

○庁舎 1 施設 ○消防施設 4 施設 ○地域公民館 1 施設 ○集会施設 1 施設
○宿泊施設 1 施設

(ウ) 売却 (2 施設)

廃校は、サウンディング型市場調査によって利活用の可能性と民間事業者のニーズを確認し、民間事業者へ土地・建物を売却しました。

○小学校 2 施設(校舎及び体育館)

(エ) 返還 (3 施設)

消防施設は、再編・統合により借用していた土地・建物を所有者へ返還しました。

○消防施設 3 施設

(オ) 用途変更 (1 施設)

消防施設は、水防倉庫としての役目を終え、大江支所の所管としました。

○消防施設 1 施設

※用途変更については、延床面積の削減とならないため P4(表 3)の削減対象施設及び面積に含めません。

(カ) 貸付(1 施設)

産業振興施設は、指定管理者制度によって管理運営を行っていましたが、指定期間の終了に合わせて普通財産化し、地域コミュニティの拠点施設として活用するため、地元への貸付を行いました。

○産業振興施設 1 施設

※貸付については、延床面積の削減とならないため P4(表 3)の削減対象施設及び面積に含めません。

ウ 公共施設マネジメント全体の取組み

(ア) 後期実施計画(R2～R6)の策定

前期実施計画の実績や課題を踏まえ、令和2年7月に「後期実施計画 (R2～R6)」を策定し、基本計画期間後半5年間の再配置区分を整理しました。

(イ) 個別施設計画の策定

令和3年3月に個別施設計画を策定し、長寿命化等の具体的な対策内容について定めるとともに、各施設の構造や部位別の耐用年数に基づき今後も存続する施設に必要な対策内容や時期や費用を試算しました。

(ウ) 金融機関との公民連携促進に関する連携協定の締結

廃校などの大規模遊休資産等の利活用促進に向け、株式会社京都銀行と京都北都信用金庫と公民連携促進に関する連携協定の締結を行いました。地域資源の有効活用・人材育成・情報発信などで協力し、公民連携を促進させていきます。



〈連携協定締結式〉

(エ) 廃校にかかるサウンディング型市場調査及び利活用にむけての民間事業者募集実施

大規模遊休資産である廃校の利活用を促進するため、旧佐賀小学校、旧川合小学校、旧公誠小学校・旧北陵中学校について個別にサウンディング型市場調査を実施し、利活用の可能性と民間事業者等の活用条件を確認しました。

その中で、具体的な利活用のニーズが高く、土地・建物の貸付・売却準備が完了した佐賀小学校については、公募型プロポーザル方式による民間事業者募集を実施し、売却を行いました。



〈サウンディング型市場調査〉

(オ) 廃校マッチングバスツアーの開催

施設毎に個別に見学を実施するのではなく、一日で複数の施設を見学することにより、効率的にサウンディング型市場調査を実施し、市内に存在する多数の廃校の利活用を一層推進するため、令和2年10月23日、11月20日の2回に分け、6校（10月23日：旧菟原小学校、旧細見小学校、旧上六人部小学校、11月20日：旧明正小学校、旧金谷小学校、旧天津小学校）を巡る廃校マッチングバスツアーを開催しました。

バスツアーで行った参加事業者へのアンケート調査を踏まえ、参加事業者への追加対話を実施し、具体的な利活用検討を進めています。

202 **京都 福知山** 参加無料

1校だけの現地参加も可！
この機会を見逃すな！

**廃校マッチング
バスツアー**

京都駅発着！
定員 **30名** (各コース15名)

Aコース 10月23日(金)
Bコース 11月20日(金)

ツアー行先
・両コースとも京都駅を午前8時35分に出発し、午後5時～5時30分頃京都駅に到着予定。
・交通費等により、時間が前後する場合がございます。

Aコース	10:00	10:50	13:10	14:10
	旧 美原小学校・旧 細見小学校・活用事例	旧 上六人部小学校		
Bコース	10:50	11:30	13:20	14:25
	旧 明正小学校・旧 壺谷小学校・旧 天津小学校・活用事例			

※1 ツアーの詳細は応じて変更します。
※2 集合時間より15分前着及び解散時間後15分の遅刻については、各自で負担ください。
※3 活用事例では、旧上六人部小学校のマイ子館増設を行っている事業も掲載します。

〈廃校マッチングバスツアー〉



〈旧明正小学校の中庭でのオリエンテーション〉



〈旧上六人部小学校でのツアー中の様子〉

(3) 進捗状況に対する評価

ア 存続施設への取組み

これまで、公共施設マネジメントの取組みは、主に譲渡や除却などによる総量削減とそれによる更新費の削減をめざして進められてきましたが、前期実施計画での短期目標未達が大きく影響し、令和2年度時点では中期目標に対し達成度は24.2%と、進捗に時間を要しています。

後期実施計画では、こうした総量削減の取組みに加えて、存続する施設の長寿命化や用途廃止した施設の民間への貸付など、多角的に取組みを進めることにより、将来の更新費の削減や財源の確保を図っていくこととしています。

令和2年度は、既に策定済みであった学校や公営住宅、都市公園内の施設を除く施設について、個別施設計画を策定し、これまで積極的に取り組めていなかった存続する施設に対する取組みをスタートしました。

イ 削減対象施設への取組み

削減対象施設105,448㎡のうち、再配置区分が「用途廃止(検討)」の施設は47,657㎡と45.19%、「譲渡」の施設は21,076㎡と19.98%と大部分を占めており、目標達成に向けて重点的に取り組む必要がありました。

そこで、「用途廃止(検討)」の大部分を占める廃校などの大規模遊休資産の利活用に取り組むべく、積極的にサウンディング型市場調査を実施するとともに、新たに廃校マッチングバスツアーを開催し、民間事業者のニーズを把握するとともに、貸付・売却条件の整理など活用に向けて課題解決に取り組んだ結果、廃校施設(校舎、体育館)2,435㎡の売却につながりました。

一方で、「譲渡」の対象となっている集会施設等は、新型コロナウイルスの影響もあり、地元との協議が進みませんでした。

ウ 公民連携の促進の取組み

これまでも試行的にサウンディング型市場調査を実施し、公民連携事業に取り組んできましたが、更に公民連携事業を促進するため、金融機関と公民連携促進に関する連携協定を締結しました。

今年度は、連携協定締結の1年目でしたが、廃校マッチングバスツアーの事業化や、定期的な情報交換を行うなど、2年目以降につながる取組みを実施できました。

(4) 今後の取組みの進め方について

ア 存続対象施設について

長寿命化にかかる費用を試算した個別施設計画によると、後期計画で整理した再配置区分に基づき取組みを推進することで、大幅な将来の更新費削減につながる試算結果となっており、今後も後期計画に基づく総量削減と個別施設計画に基づく計画的な改修等の対策を実施していきます。

既に具体的な長寿命化や改修を予定している施設については、スケジュールに沿った事業化を進めます。その他の施設についても、必要性の高い施設から優先順位をつけて具体的に計画を策定し、存続に向けて必要な工事内容や時期、費用の把握に努めます。

イ 譲渡対象集会施設の新たな支援の枠組み

「避難のあり方検討会」の結果を踏まえ、集会所の譲渡に関する地元の不安を取り除くため、一次避難所に指定されている集会施設を中心に、新たな支援策を設けました。

公共施設マネジメントを進めるにあたっては、地元合意が重要であり、新型コロナウイルスの状況を注視しつつ、引き続き地域ごとの事情や住民の利便性向上等を念頭において、地元等関係者に対して丁寧な説明を行っていきます。

ウ 大規模遊休資産の利活用について

令和2年度に実施した廃校マッチングバスツアーの結果を踏まえ、具体的な利活用に繋げるため、民間事業者のニーズが高い施設から優先順位をつけて、利活用事業者の募集を実施します。

令和2年度をもって廃校となった大江地域の3小学校や、事業者募集の実施に至らない施設についても、新たな廃校利活用マッチングバスツアーの実施やツアー参加事業者へのサウンディング等を実施するとともに、民間事業者が参入しやすい制度設計を行うことにより取組みを強化、継続していきます。

4 用途大分類 年度別進捗状況

(1) 公用施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	1	0	0	0	0
		4 合意	5	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	7	0	0	0	0
具体的な取組	防災の拠点施設(消防防災センター、福知山消防署東分署、福知山消防署北分署)について、個別施設計画に長寿命化の方針を定めた。						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●個別施設計画に長寿命化の方針を定めた施設(3施設) 消防防災センター、福知山消防署東分署、福知山消防署北分署 ●消防団の統廃合について地元と合意した施設(2施設) 佐賀分団第1部(私市・報恩寺)本部、河守分団第3部(金屋) 					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	5	0	0	0	0	
		2 着手済	0	5	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	6	1	0	0	0	0	
		4 合意	14	15	0	0	0	0	
		5 事業中	13	9	0	0	0	0	
		6 完了	1	9	0	0	0	0	
		合計	35	44	0	0	0	0	
進捗状況	完了	年度削減面積	160	484	0	0	0	0	
		累計削減面積	2,837	3,321	0	0	0	0	
		更新費削減額	64	192	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	947	1,139	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	4,978	4,236	0	0	0	
		累計更新費削減額	1,733	1,426	0	0	0	0	
具体的な取組	<p>【用途変更】 役目を終えた施設について、用途を変更した。 河東水防倉庫</p> <p>【除却】 用途廃止した施設を除却した。 旧門垣支庁、川合分団第1部(大原・台頭)、川合分団第2部(上川合・加用)、上夜久野分団第2部(西垣)、河東分団第2部(尾藤口)</p> <p>【返還】 消防施設の統廃合により、施設を用途廃止し、土地を所有者に返還した。 川合分団第3部(岬・下川合)本部、河東分団第1部(在田)、川北水防倉庫</p>								
	取組状況の内訳(R2年度)	4 合意	<p>●消防施設(15 施設)</p> <p>修斉分団第1部(上荒河)、上六分団第1部(生野)、上六分団第2部(三俣)本部、上六分団第3部(池田)、佐賀分団第2部(印内・山野口)、菟原分団第1部(菟原下)本部、菟原分団第2部(菟原中)、菟原分団第3部(高杉・友瀧)、菟原分団第4部(大身)、細見分団第5部(中出・西松)、上夜久野分団第4部(平野)、河守分団第3部(波美・上野)、下六長田北消防器具庫、池田水防倉庫、河守水防倉庫</p>						
		5 事業中	<p>●消防施設(9 施設)</p> <p>庵我分団第1部(城山)本部、庵我分団第2部中班(中)、庵我分団第2部池部班(池部)、三岳分団第1部(一ノ宮)本部、三岳分団第2部(佐々木)、有路下分団第1部(三河・高津江)、有路下分団第2部(二箇)常願寺消防器具庫、有路下水防倉庫</p>						
6 完了		<p>●庁舎(1 施設)</p> <p>旧門垣支庁</p> <p>●消防施設(8施設)</p> <p>川合分団第1部(大原・台頭)、川合分団第2部(上川合・加用)、川合分団第3部(岬・下川合)本部、上夜久野分団第2部(西垣)、河東分団第1部(在田)、河東分団第2部(尾藤口)、川北水防倉庫、河東水防倉庫</p>							
備考	河東水防倉庫については、用途変更のため削減実績には計上しない。								

(2) 教育施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	25	0	0	0	0
		3 課題の明確化	6	0	0	0	0
		4 合意	10	0	0	0	0
		5 事業中	2	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	43	0	0	0	0
具体的な取組	<p>旧三岳小学校について、三岳地区の公共施設の集約化・複合化に伴う改修工事に着工した。</p> <p>福知山市学校給食センターについて、大江学校給食センターを福知山市学校給食センターに統合するため設備の増強を行った。</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(5 施設) 大正小学校、惇明小学校、昭和小学校、修斉小学校、成仁小学校 ●中学校及び小中一貫校(5 施設) 桃映中学校、南陵中学校、成和中学校、日新中学校、大江中学校 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(1 施設) 旧三岳小学校 ●学校給食センター(1施設) 福知山市学校給食センター 					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		1	2	0	0	0	0
		2 着手済		0	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化		3	9	0	0	0	0
		4 合意		8	16	0	0	0	0
		5 事業中		2	3	0	0	0	0
		6 完了		1	2	0	0	0	0
		合計		15	32	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	0	2,435	0	0	0	0	
		累計削減面積	278	2,713	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	769	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	92	861	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	24,764	24,192	0	0	0	0
			累計更新費削減額	6,143	6,071	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【売却】</p> <p>サウンディング型市場調査の調査結果を踏まえ、利活用事業者を募集し、民間事業者に売却した。</p> <p>旧佐賀小学校、旧佐賀小学校体育館</p>								
	取組状況の内訳(R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(15 施設) 旧天津小学校、旧天津小学校体育館、旧上六人部小学校、旧上六人部小学校体育館、旧金谷小学校、旧金谷小学校体育館、旧公誠小学校、旧公誠小学校体育館、旧菟原小学校、旧菟原小学校体育館、旧川合小学校、旧川合小学校体育館、旧細見小学校、旧細見小学校体育館、旧明正小学校 ●学校給食センター(1施設) 大江学校給食センター 						
5 事業中		<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(2 施設) 旧中六人部小学校、旧中六人部小学校体育館 ●学校給食センター(1 施設) 旧夜久野学校給食センター 							
6 完了		<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(2 施設) 旧佐賀小学校、旧佐賀小学校体育館 							
備考	後期実施計画における再配置区分等の見直しに伴い、旧三岳小学校を「用途変更」としたことにより、合意以上の累計削減面積及び累計更新費削減額が減少した。								

(3) 公営住宅

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	5	0	0	0	0
		3 課題の明確化	2	0	0	0	0
		4 合意	9	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	1	0	0	0	0
		合計	18	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】 施設の長寿命化を図るため、給排水設備(バルク貯水槽)の更新を行った。 秋津が丘団地</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<p>●市営住宅(9 施設) 東堀団地、宮ノ下団地、岡ノ三団地、広峯団地、夕陽が丘団地、南岡団地、旭が丘団地、矢見所団地、南佳屋野団地</p>					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	<p>●市営住宅(1 施設) 秋津が丘団地</p>					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	14	0	0	0	0
		2 着手済	5	4	0	0	0	0
		3 課題の明確化	1	0	0	0	0	0
		4 合意	0	2	0	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0	0
		6 完了	2	0	0	0	0	0
		合計	10	21	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	2,559	0	0	0	0	0
		累計削減面積	4,004	4,004	0	0	0	0
		更新費削減額	716	0	0	0	0	0
		累計更新費削減額	1,214	1,214	0	0	0	0
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	4,069	7,095	0	0	0
		累計更新費削減額	1,225	1,662	0	0	0	
具体的な取組	<p>向野団地のつつじが丘団地への統合について住民の合意を得た。 門垣団地について、地元からの除却の要望があり、除却の方針について庁内で合意した。</p>							
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●市営住宅(2施設) 向野団地、門垣団地 						
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●その他住宅(1施設) 新庄市営一戸建住宅 						
	6 完了	該当なし						
備考								

(4) 市民文化系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	23	0	0	0	0
		2 着手済	5	0	0	0	0
		3 課題の明確化	2	0	0	0	0
		4 合意	4	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	1	0	0	0	0
		合計	35	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【複合化】</p> <p>集会施設の2階部分に介護職員実務者研修施設機能を移転し、有効活用することで複合化を図った。</p> <p>多目的集会施設中六人部会館・地域活性化拠点施設</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<p>●市民会館・地域公民館(4施設)</p> <p>成和地域公民館(豊富農村環境改善センター)、六人部地域公民館、川口地域公民館、日新地域公民館</p>					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	<p>●集会施設(1施設)</p> <p>多目的集会施設中六人部会館・地域活性化拠点施設</p>					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)		
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	13	2	0	0	0	0	0	
		2 着手済	10	7	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	28	17	0	0	0	0	0	
		4 合意	33	30	0	0	0	0	0	
		5 事業中	14	25	0	0	0	0	0	
		6 完了	4	3	0	0	0	0	0	
		合計	102	84	0	0	0	0	0	
進捗状況	完了	年度削減面積	838	827	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	2,992	3,819	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	266	331	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	1,029	1,360	0	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	11,160	14,935	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	3,745	4,993	0	0	0	0		
具体的な取組	【除却】 用途廃止した集会施設を除却した。 山村基幹集落センター(北陵地域公民館)、下天津公民館									
	【譲渡】 集会施設を地元へ譲渡した。 生活改善センター宮会館									
取組状況の内訳(R2年度)	4 合意	●集会施設(30 施設) 人権ふれあいセンターさわやか館、小谷ヶ丘公民館、堀センター、惇明西集会所、緑ヶ丘集会所、偕和会館、本町集会所、新庄集会所、駒場新町集会所、喜多公民館、土師町公会堂、土師新町南公会堂、土師新町東公会堂、石原公会堂、平野町集会所、菟原下二総合会館、菟原下二共同集会所、後野集会所、中夜久野集会所、千原共同集会所、金屋共同集会所、俊明多目的集会所、定住促進センター庵我会館、多目的集会施設下川口会館、喜多生活改善センター、多目的集会施設金山会館、多目的集会施設天座会館、夜久野町畑集落センター、多目的集会施設上夜久野構造改善会館、有路下多目的集会所								
	5 事業中	●集会施設(25 施設) 一ノ宮教育集会所、堀口集会所(増築分)、駅南西陵集会所、室集会所、牧公民館、口田野公会堂、大野公民館、一ノ宮集会所、土師宮町公会堂、中田集会所、舟越会館、一尾林業会館、集落センター石本会館、樽水林業会館、生活改善センター萩原会館、構造改善センター岩間会館、多目的集会施設六十内会館、多目的集会施設三岳会館、下佐々木林業会館、多目的集会施設興会館、構造改善センター戸田会館、多目的集会施設佐賀会館、台頭コミュニティセンター、河西上生活改善センター、一ノ宮老人施設								
	6 完了	●集会施設(3 施設) 山村基幹集落センター(北陵地域公民館)、下天津公民館、生活改善センター宮会館								
備考										

(5) 医療施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	1	0	0	0	0
具体的な取組	三和歯科診療所について、令和元年 11 月より診療を再開した。雨漏りが発生しているため、屋根の改修工事が必要であり、実施時期の検討をしている。						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 三和歯科診療所					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	1	0	0	0	0	
		5 事業中	1	2	0	0	0	0	
		6 完了	0	0	0	0	0	0	
		合計	2	3	0	0	0	0	
進捗状況	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	182	282	0	0	0	0
			累計更新費削減額	73	102	0	0	0	0
具体的な取組	三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)について土地の測量等を行い、整理を進めている。								
	取組状況の内訳(R2年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 国民健康保険金谷診療所						
5 事業中		●診療施設(2施設) 三岳診療所、三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)							
6 完了		該当なし							
備考									

(6) 子育て支援施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	3	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	1	0	0	0	0
		6 完了	1	0	0	0	0
		合計	6	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【大規模改修】 こども園化に向けて、老朽化した壁や天井等の大規模改修を実施した。 三和保育園</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●児童館(1施設) 上夜久野児童館 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●保育園(1施設) 三和保育園 					
備考							

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		2	3	0	0	0	0
		2 着手済		0	1	0	0	0	0
		3 課題の明確化		1	1	0	0	0	0
		4 合意		5	5	0	0	0	0
		5 事業中		1	1	0	0	0	0
		6 完了		1	0	0	0	0	0
		合計		10	11	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	275	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	3,480	3,480	0	0	0	0	
		更新費削減額	91	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	1,230	1,230	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む 参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	6,526	6,861	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	2,129	2,232	0	0	0	0	
具体的な取組	下六人部保育園について、事業継続を条件としてプロポーザルを実施し、民間事業者を選定した。令和 3 年 4 月譲渡予定。								
	取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	●保育所(5 施設) 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園						
5 事業中		●保育所(1 施設) 下六人部保育園							
6 完了		該当なし							
備考									

(7) 保健・福祉施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	0	0	0	0	0
具体的な取組	現時点で後期実施計画期間中に長寿命化工事予定の施設なし。(維持管理修繕を除く。)						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	0	0
		2 着手済	1	1	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	3	3	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0	0	0
		5 事業中	2	2	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0	0	0
		合計	6	6	0	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	1,515	1,515	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	545	545	0	0	0	0	
	※累計は 前期実績 を含む	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,505	2,155	0	0	0	0
			累計更新費削減額	887	948	0	0	0	0
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	該当なし							
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●その他の社会福祉施設(1 施設) 夜久野町ふれあいの里福祉センター ●介護老人保健施設(1 施設) 夜久野町ふれあいの里ミニデイサービスセンター 							
	6 完了	該当なし							
備考									
具体的な取組	譲渡等に向けて施設毎に課題を整理している。								

(8) 産業系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	1	0	0	0	0
		4 合意	1	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	4	0	0	0	0
具体的な取組	<p>食肉センターは、衛生にかかる制度改正に伴い新たな設備投資を検討する必要があるなか、利用率が急激に悪化し、回復の見通しが立たないことから施設の運営休止を決定した。</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<p>●産業振興施設(1施設) 食肉センター</p>					
	5 事業中	<p>該当なし</p>					
	6 完了	<p>該当なし</p>					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	0	
		2 着手済	24	23	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	6	7	0	0	0	0	
		4 合意	4	7	0	0	0	0	
		5 事業中	3	2	0	0	0	0	
		6 完了	1	1	0	0	0	0	
		合計	38	40	0	0	0	0	
進捗状況	完了	年度削減面積	50	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	3,697	3,697	0	0	0	0	
		更新費削減額	20	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	1,241	1,241	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	4,305	8,579	0	0	0	0
			累計更新費削減額	1,522	3,552	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【貸付】</p> <p>指定管理者制度で管理運営を行っていた施設を指定期間の終了に合わせて、普通財産化し、地域コミュニティの拠点施設として活用するため、地元に貸付した。</p> <p>里の駅みたけ</p>								
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(6施設) 下猪崎共同農作業所、新庄農作業所、新庄農機具保管庫⑥・⑦、新庄農機具保管庫⑨、石本農作業所、後野農機具保管庫 ●産業振興施設(1施設) 公設地方卸売市場 							
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(2施設) 下猪崎共同農作業所、新町農業作業所 							
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●産業振興施設(1施設) 里の駅みたけ 							
備考	里の駅みたけについては、貸付のため削減面積に計上しない								

(9) 観光・宿泊(研修)施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	2	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	3	0	0	0	0
具体的な取組	長寿命化等の改修に向けて施設毎に課題を整理している。						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		0	0	0	0	0	0
		2 着手済		5	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化		1	13	0	0	0	0
		4 合意		8	2	0	0	0	0
		5 事業中		3	1	0	0	0	0
		6 完了		0	1	0	0	0	0
		合計		17	17	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	0	1,003	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	1,003	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	178	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	178	0	0	0	0	
	※累計は 前期実績 を含む	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,437	2,359	0	0	0	0
			累計更新費削減額	614	484	0	0	0	0
具体的な取組	<p>【除却】 平成30年7月豪雨災害の影響によって敷地法面が崩落し、安全性の確保が困難となった施設について除却した。 こぶし荘</p>								
	取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 宿泊(研修施設)(1 施設) 旧三岳青少年山の家 ● 観光施設(1 施設) 野鳥の森管理棟 						
5 事業中		<ul style="list-style-type: none"> ● 宿泊(研修施設)(1 施設) 夜久野町緑の里交流センター 							
6 完了		<ul style="list-style-type: none"> ● 宿泊(研修施設)(1 施設) こぶし荘 							
備考									

(10) 生涯学習系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	7	0	0	0	0
		2 着手済	2	0	0	0	0
		3 課題の明確化	11	0	0	0	0
		4 合意	8	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0
		合計	28	0	0	0	0
具体的な取組	<p>個別施設計画及び公園長寿命化計画に基づき施設の整備に向けて検討を進めている。 公園施設等長寿命化計画や福知山市スポーツ推進計画に基づき、三段池公園テニスコートへ市民運動場の庭球場の集約化を進めている。</p>						
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●博物館(1施設) 児童科学館 ●体育施設(体育館)(5施設) 三段池公園総合体育館、成和地域体育館、六人部地域体育館、川口地域体育館、日新地域体育館 ●体育施設(運動場)(2施設) 三段池公園テニスコート、市民運動場 					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		4	3	0	0	0	0
		2 着手済		8	1	0	0	0	0
		3 課題の明確化		0	2	0	0	0	0
		4 合意		4	3	0	0	0	0
		5 事業中		2	1	0	0	0	0
		6 完了		0	0	0	0	0	0
		合計		18	10	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	844	844	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	169	169	0	0	0	0	
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	4,094	3,477	0	0	0	
		累計更新費削減額	976	972	0	0	0		
具体的な取組	新町文化センター内の資機材の整理について調整を行っている。								
取組状況の内訳(R2年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 体育施設(1 施設) 三和町鹿倉運動公園プール ● その他施設(2 施設) 夜久野町太鼓練習場 夜久野町教育文化会館 							
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 博物館(1 施設) 新町文化センター 							
	6 完了	該当なし							
備考									

(11) その他

再配置区分		存続施設					(単位:施設)	
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	0	0	0	0	
		5 事業中	0	0	0	0	0	
		6 完了	0	0	0	0	0	
		合計	1	0	0	0	0	
具体的な取組	齋場について、個別施設計画に長寿命化の方針を定めた。							
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	●その他施設(1施設) 齋場						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分		削減対象施設						(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R01	R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0	0
		6 完了	0	0	0	0	0	0
		合計	1	1	0	0	0	0
進捗状況	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	0
		累計削減面積	276	276	0	0	0	0
		更新費削減額	0	0	0	0	0	0
		累計更新費削減額	99	99	0	0	0	0
	※累計は前期実績を含む	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	360	360	0	0	0
		累計更新費削減額	116	116	0	0	0	
具体的な取組	その他施設「教員住宅(上川合)」の処分方法について関係機関と協議を行っている。							
取組状況の内訳 (R2年度)	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●その他施設(1施設) 教員住宅(上川合)						
	6 完了	該当なし						
備考								
