

**福知山市公共施設マネジメント
令和3年度実施計画進捗状況報告書**



福知山市公共施設マネジメント推進本部

目次

1 進捗状況報告の目的.....	1
2 到達度評価.....	1
(1) 検証の対象.....	1
(2) 到達度の区分.....	1
(3) 後期実施計画の対象施設数について.....	2
3 令和3年度実施計画進捗状況のまとめ.....	3
(1) 進捗概要.....	3
(2) 今年度の取組み概要.....	5
(3) 進捗状況に対する評価.....	10
(4) 今後の取組みの進め方について.....	11
4 用途大分類 年度別進捗状況.....	12
(1) 公用施設.....	13
(2) 教育施設.....	15
(3) 公営住宅.....	17
(4) 市民文化系施設.....	19
(5) 医療施設.....	21
(6) 子育て支援施設.....	23
(7) 保健・福祉施設.....	25
(8) 産業系施設.....	27
(9) 観光・宿泊(研修)施設.....	29
(10) 生涯学習系施設.....	31
(11) その他.....	33

1 進捗状況報告の目的

福知山市の公共施設マネジメントは、平成26年度に策定した「基本方針」及び「基本計画」を着実に推進するため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定めた「実施計画」を5年ごとに策定し、計画を進めています。

「前期実施計画（H27～R1）」の実績や課題を踏まえて、令和2年7月に「後期実施計画（R2～R6）」を策定し、再配置方針を整理しました。

また、後期実施計画で定めた再配置区分に基づき、令和3年3月に「個別施設計画（R3～R12）」を策定し、個々の公共施設の長寿命化等に向けた取り組みやその効果についてとりまとめました。

本報告書では、前期実施計画から取り組みを進めている公共施設の総量削減に加え、新たに存続する施設の長寿命化や用途廃止を行い遊休資産となった施設の利活用など、総コスト削減につながる取り組みについても進捗管理を行い、公共施設マネジメント全体の進捗状況として評価・検証することで、市民の皆様へ公共施設マネジメントの取り組みを理解していただくことを目的とします。

2 到達度評価

(1) 検証の対象

到達度検証の対象は、後期実施計画で定められた再配置区分の全て（「存続（長寿命化）」「存続（更新）」「用途変更」「統合」「譲渡」「用途廃止」）を対象として、到達度を検証・把握します。

前期実施計画では、削減する施設を中心に進捗管理を行っていましたが、計画的な長寿命化対策等により施設を安全かつ良好な状態に保つため、後期実施計画では、存続する施設についても進捗管理を行うこととしています。

ただし、再配置区分が「存続（長寿命化・更新なし）」の施設は、後期実施計画期間中に具体的な取り組みが実施されないため原則対象外とし、必要に応じて到達度を検証します。

(2) 到達度の区分

到達度については、対象施設の再配置区分により①「存続施設（長寿命化等の対策を行う施設）」と②「削減対象施設（譲渡や除却等を行う施設）」の2つに分類し、整理します。

到達度は、1未着手、2着手済、3課題の明確化、4合意、5事業中、6完了の6段階に区分して公共施設マネジメントの進捗状況を把握します。

6段階に区分することにより、それぞれの段階で生じる課題に対して適切な推進策を講じることが可能となります。

特に「4合意」の段階については、利用者等との間で再配置（存続、削減）に関する諸課題解決の方向性について、具体的な事業実施に関する合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階としています。

① 存続施設(長寿命化等の対策を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	長寿命化等の計画について関係者との協議が未着手
2 着手済	具体的な対策内容や時期について関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	必要な対策や時期が関係者との間で明確に共有されたうえで、事業化に向けて協議している段階
4 合意	必要な対策の内容や時期について庁内調整が整い、後期計画期間中を目安に事業化の合意形成が図れた段階
5 事業中	施設を長く使用するために、建物や設備の耐久性が高まる長寿命化等に関する以下の大規模改修の設計・工事に着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・外壁（外断熱工事、塗装工事など） ・屋上防水（シート防水、屋上断熱など） ・給排水管更新（高架水槽の更新を含む） ・用途変更に伴う間取り、構造変更等の大規模改修
6 完了	工事の完了

※存続施設に関しては、後期実施計画(5年間)に実施する対策について進捗を管理します。

※再配置区分が存続（長寿命化・更新なし）の施設であっても、改修を実施する場合は進捗を管理します。

② 削減対象施設(譲渡や除却等を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	関係者との協議が未着手で内部検討の段階
2 着手済	関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議している段階
4 合意	課題解決に向けて、具体的な事業実施に関する合意形成が図れた段階
5 事業中	登記上の整理や法的に必要な手続きに着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・土地の測量、分筆 ・不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・家屋譲渡等届出書（庁内） ・条例改正 等
	譲渡のための機能補修や除却にかかる設計・工事に着手している段階
6 完了	手続き及び工事の完了、施設の引渡

※削減対象施設に関しては、対象となっているすべての施設について進捗を管理します。

(3) 後期実施計画の対象施設数について

公共施設マネジメントの対象施設は、基本計画策定時点で 734 施設 459,502 m²でした。

実施計画では、公園（106 施設 3,169 m²）やバス待合所、トイレなど比較的小規模な施設（40 施設 2,926 m²）は修繕等の費用が比較的安価であるため、進捗管理の対象施設から除外しています。

また、複合施設は同一建物でも機能が異なる場合は複数施設とする機能単位で整理していましたが、長寿命化計画を策定するにあたり、施設の機能や構造、耐用年数により一部施設数を変更しています。そして、前期実施計画期間中の実績としては、95 施設 19,923 m²を削減したことにより、後期実施計画は、対象施設を 534 施設 429,281 m²として取組みをスタートしています。

3 令和3年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 対象施設にかかる到達度別の進捗状況

(表 1) 到達度進捗状況表(施設数)では、公共施設マネジメント後期実施計画の再配置区分に基づき、後期実施計画期間の進捗状況について、施設数で取りまとめています。

令和3年度は、「存続(長寿命化)」の施設が2施設、「統合(存続)」の施設が1施設の合計3施設の再配置が完了しました。削減対象施設では、「統合(廃止)」の施設が8施設、「譲渡」の施設が12施設、「用途廃止(除却)」の施設が3施設、「用途廃止(貸付)」の施設が1施設、「用途廃止(検討)」の施設が8施設の合計32施設が完了となっています。存続施設と削減対象施設の合計では、35施設の再配置が完了しています。

再配置区分別では、存続施設となっている265施設のうち116施設について長寿命化等の協議に着手し、着手率は43.8%となっています。長寿命化等の対策の実施に合意ができています施設数は55施設となっており、合意率は20.8%となっています。

削減対象施設では、269施設のうち248施設について譲渡や除却等の協議に着手し、着手率は92.2%となっています。また、譲渡や除却等の実施に合意ができています施設数は161施設であり、合意率は59.9%となっています。

全体では、534施設のうち364施設について関係者等との協議に着手し、着手率は68.2%となっています。また、再配置について関係者等との合意ができています施設数は216施設あり、合意率は40.4%となっています。

イ 削減対象施設の進捗状況(延床面積)

(表 2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)では、後期実施計画期間の進捗状況を延床面積で取りまとめています。

令和3年度に再配置が完了した削減対象施設の面積は、13,990㎡でした。このうち、譲渡や除却等の実際に延床面積の削減に繋がった施設は3,553㎡となっています。

再配置区分別では、「譲渡」の施設の削減面積が2,836㎡となり、全体の削減面積に大きく寄与しています。

現状、削減対象施設のうち97,578㎡に着手し、着手率は92.5%となっています。また、73,672㎡については合意済みであり、合意率は69.9%となっています。

今年度は、「用途廃止(検討)」としていた施設について、廃校を中心に貸付が決定したため、10,161㎡の再配置が完了となっています。貸付のため、延床面積の削減には繋がっていませんが、昨年度は課題の明確化や合意までで止まっていた施設の再配置が進んでいます。

ウ 中期目標に対する削減進捗状況(削減面積・削減効果額)

(表 3) 中期目標に対する削減進捗状況表では、基本計画の中期目標に対する後期実施計画期間の累計削減実績と削減効果額の進捗状況を取りまとめています。

令和3年度は再配置が完了した削減対象施設32施設のうち、23施設3,553㎡が譲渡、除却などの削減につながりました。令和3年度までの累計削減実績は132施設28,225㎡となり、基本計画で設定した中期目標の101,800㎡に対し達成率は27.7%となりました。

削減効果額は、令和3年度では13億2,700万円となり、令和3年度までの累計では93億6,300万円と、中期目標の292億円に対し、累計達成率は32.1%となりました。

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)

再配置区分	施設数	2	3	4	5	6	R3年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了				
存続	存続(長寿命化)	119	31	16	25	9	4	2	85	38
	存続(更新)	3	0	0	0	1	0	0	1	1
	存続(長寿命化・更新なし)	115	4	5	5	0	0	0	14	5
	用途変更	3	0	0	0	2	0	0	2	2
	統合(存続)	25	5	0	4	3	2	1	14	9
	存続施設合計	265	40	21	34	15	6	3	116 (43.8%)	55 (20.8%)
削減	統合(廃止)	44	7	0	13	9	13	8	42	35
	譲渡	118	37	19	19	24	15	12	114	58
	用途廃止(除却)	39	2	5	10	6	8	3	31	24
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	11	0	7	0	0	3	1	10	3
	用途廃止(検討)	57	0	10	23	7	11	8	51	41
	削減対象施設合計	269	46	41	65	46	50	32	248 (92.2%)	161 (59.9%)
総計	534	86	62	99	61	56	35	364 (68.2%)	216 (40.4%)	

(表2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)

再配置区分	延床面積	2	3	4	5	6	R3年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了				
削減	統合(廃止)	14,495	229	0	12,180	1,521	447	326	14,377	14,148
	譲渡	21,076	4,070	5,354	4,543	3,529	3,053	2,836	20,549	11,125
	用途廃止(除却)	15,106	880	3,081	3,797	1,974	3,118	391	12,850	8,889
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	7,114	0	3,600	0	0	3,062	276	6,662	3,062
	用途廃止(検討)	47,657	0	6,692	16,019	7,675	12,754	10,161	43,140	36,448
	削減対象施設合計	105,448	5,179	18,727	36,539	14,699	22,434	13,990	97,578 (92.5%)	73,672 (69.9%)

譲渡、除却等の延床面積の削減に
繋がった施設は 3,553 m²

(表3) 中期目標に対する削減進捗状況表

		H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03
単年度	削減施設数(単年度)	7	34	19	26	9	14	23
	削減面積(単年度)	3,989	5,246	3,872	2,934	3,882	4,749	3,553
	削減効果額(百万円)	1,383	1,889	1,329	808	1,157	1,470	1,327
累計	削減施設数(累計)	7	41	60	86	95	109	132
	削減面積(累計)	3,989	9,235	13,107	16,041	19,923	24,672	28,225
	削減効果額(百万円)	1,383	3,272	4,601	5,409	6,566	8,036	9,363
達成率	削減面積(目標:101,800m ²)	3.9%	9.1%	12.9%	15.8%	19.6%	24.2%	27.7%
	削減効果額(目標:約292億)	4.7%	11.2%	15.8%	18.5%	22.5%	27.5%	32.1%


※譲渡、除却など延床面積の削減につながる実績のみ計上しています。

このため、(表1)の削減対象施設合計に含まれる貸付による9施設を除いています。


具体的な完了の内容についてはP5、P6に記載しています。

※計画における施設の進捗評価について、維持管理経費削減等に繋がる貸付の契約が開始された時点で完了とします。

(グラフ1)削減面積・削減施設数推移(単年度ごと)

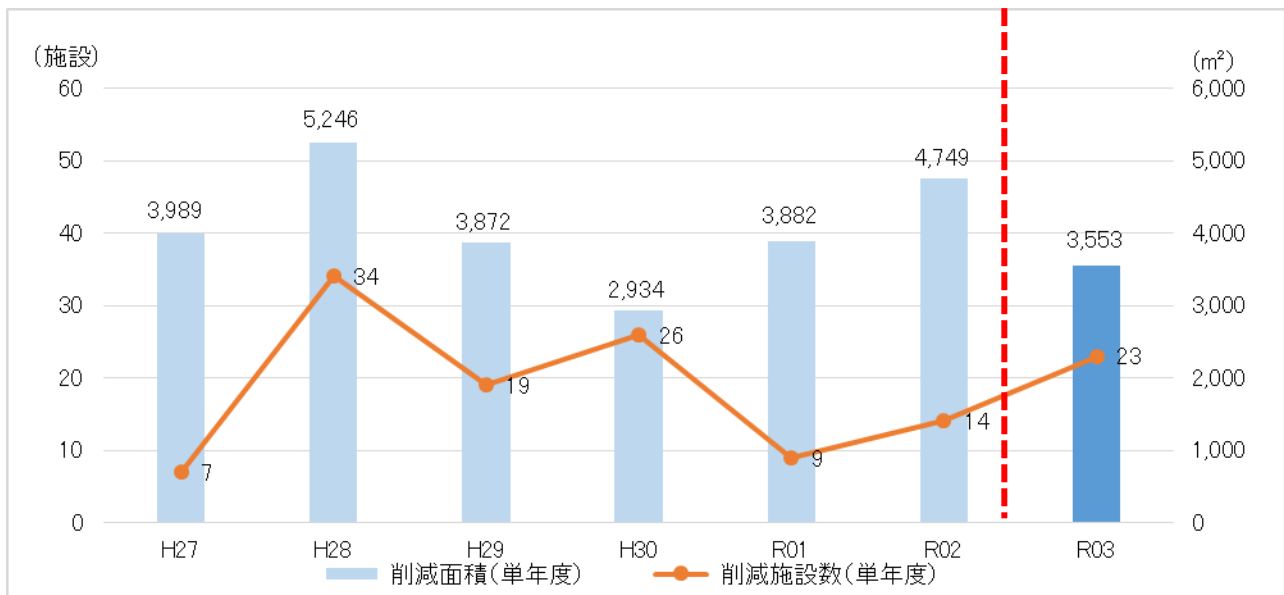

(グラフ2)到達度の累計推移(削減対象施設)

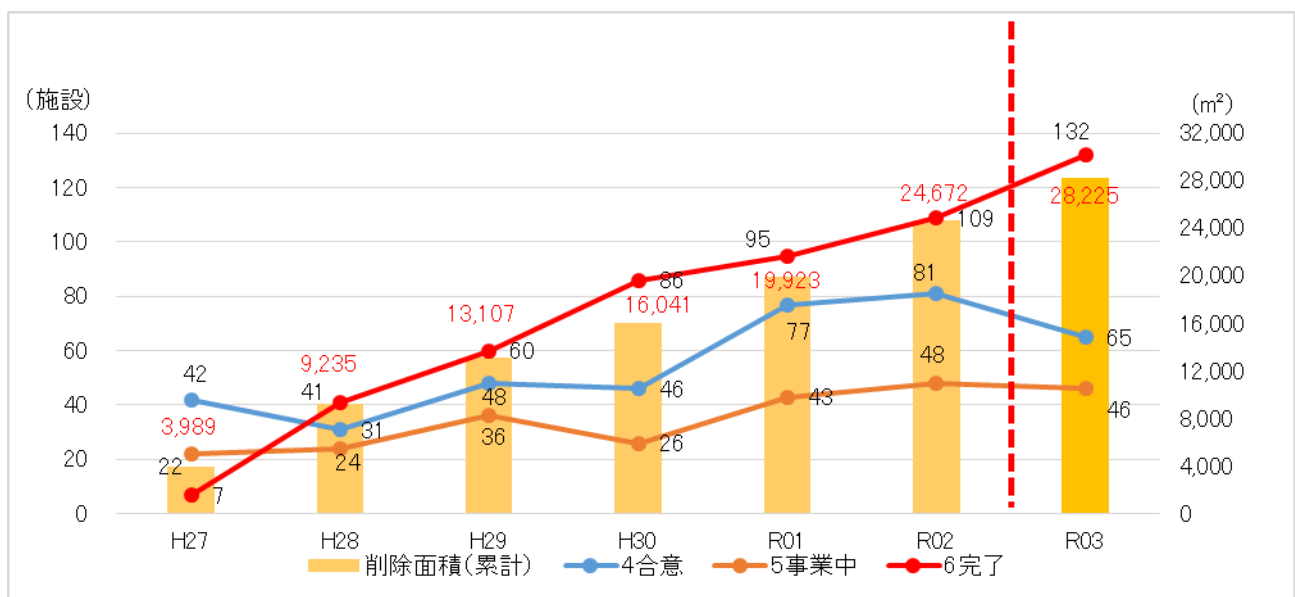

(2) 今年度の取組み概要

ア 令和3年度における完了分(存続施設 3施設)

(ア) 長寿命化(2施設)

小学校及び中学校について、学校の長寿命化計画に基づき高架水槽及び防水・外壁工事を実施しました。

○小学校 1施設 ○中学校及び小中一貫校 1施設

(イ) 統合(1施設)

2施設あった児童館の機能を1つの施設に統合しました。

○児童館 1施設

イ 令和3年度における完了分(削減対象施設 32 施設)

(ア) 譲渡 (14 施設)

消防施設は、消防団の再編・統合に伴い、土地所有者から借用していた土地は返還し、建物は譲渡しました。

集会施設は、利用者が地域住民又は特定の利用者に限られるため、地元で譲渡しました。

保育所は、プロポーザルにより民間事業者を選定し、譲渡しました。

保健福祉施設は、譲渡契約に基づき所有権移転登記が完了しました。

○消防施設 3 施設 ○集会施設 8 施設 ○保育所 1 施設
○その他社会福祉施設 1 施設 ○介護老人保健施設 1 施設

(イ) 除却 (7 施設)

用途廃止した消防施設と市営住宅、集会施設について除却しました。

○消防施設 5 施設 ○市営住宅 1 施設 ○集会施設 1 施設

(ウ) 返還 (2 施設)

消防施設は、消防団の再編・統合に伴い、自治会から借用していた土地・建物を自治会へ返還しました。

○消防施設 2 施設

(エ) 貸付(9 施設)

廃校となった小学校及び小学校体育館について、プロポーザルにより、利活用を行う民間事業者を選定し、貸付しました。また、観光施設についても、民間事業者への貸付を実施しました。

○小学校 8 施設 ○観光施設 1 施設

※貸付については、延床面積の削減とにならないため P4(表 3) の削減対象施設及び面積に含めません。

ウ 公共施設マネジメント全体の取組み

(ア) 公共施設マネジメント基本計画の改訂

前期実施計画の取組実績や個別施設計画で試算した長寿命化対策等による効果額を反映し、令和4年3月に公共施設マネジメント基本計画を改訂しました。

公共施設マネジメント基本計画の策定時に試算した削減による効果額とともに施設の長寿命化等による効果額についても計画に記載することにより計画の充実を図りました。

(イ) エリアマネジメントの推進

本市では、地域事情を踏まえた施設のあり方を検討するため、「まちづくり」の視点から、地域内で同一機能を有する施設の集約化や異なる施設機能を統合させる複合化を検討する「エリアマネジメント」の取組みを進めてきました。

令和3年度末に、旧三岳小学校(平成27年3月閉校)の校舎を活用し、三岳地区の教育集会所や複数の集会施設、消防団詰所や消防車庫を集約化・複合化し、新たな地域の拠点整備が完了しました。

また、上夜久野地区では老朽化していた人権ふれあいセンターについて機能統合を行い、上夜久野児童館の建物を改修し、人権ふれあいセンターさわやか館として活用することとしました。

それに合わせて、隣接していた中田集会所の集会施設機能についても新さわやか館を活用することし、中田集会所は解体して駐車場として整備することで駐車場確保の問題も解決しました。

新たな「さわやか館」を整備することで利用者の利便性を高めるとともにエリアマネジメントによる施設の集約化・複合化・再配置を進めました。



〈新三岳会館竣工式〉



〈新さわやか館〉

(ウ) ネーミングライツパートナーシップの締結

本市の施設の愛称を決定する権利を企業等に付与するネーミングライツパートナーシップについて、福知山市三段池公園を4つのゾーン（A・B・C・D）にわけて募集を行いました。

4つのゾーンのうち2つ（Aゾーン（動物園・植物園）・Dゾーン（多目的グラウンド・わんぱく広場・大はらっぱ））について、株式会社谷英建築と締結し、福知山市三段池公園Aゾーンについては「三段池 RAVIHOUSE 動物園」「三段池 RAVIHOUSE 植物園」、Dゾーンについては「三段池 RAVIHOUSE フィールド」「三段池 RAVIHOUSE わんぱく広場」「三段池 RAVIHOUSE 大はらっぱ」に愛称が決定しました。本市でのネーミングライツパートナーシップの締結は福知山 SEC カarbon スタジアムに続き、本市で2例目となる取組となっています。また、Cゾーンについてもネーミングライツパートナーの募集を行い、ネーミングライツパートナーの選定を行いました。



〈ネーミングライツの契約に係る調印式〉



〈三段池公園ゾーンマップ〉

(エ) 廃校リノベーションバージョンアッププログラムの実施

令和3年度は、民間事業者と廃校のマッチングの確度をより高めるため、令和2年度から実施している本市の廃校を民間事業者と巡る「福知山廃校マッチングバスツアー」を、新たに伴走支援型の「廃校リノベーションバージョンアッププログラム」として内容を拡充して実施しました。

まず、同プログラムの第一弾として、大江地域の廃校となった3小学校（旧有仁小学校、旧美河小学校、旧美鈴小学校）を巡る「マッチングバスツアー」を開催しました。

そして廃校マッチングバスツアーに続き、プログラムの第2弾として、全国で初となるAIを用いて廃校活用のアイデアを考える「地域アイデアワークショップ」実施し、廃校へ進出可能性のある民間事業者や大学生、金融機関及び市の職員が参加しました。

つづく第3弾として、廃校活用のアイデアを磨き具体的な活用イメージを描く「アイデアブラッシュアップワークショップ」を実施しました。



〈マッチングバスツアー〉



〈地域アイデアワークショップ〉



〈アイデアブラッシュアップワークショップ〉

(参考) 廃校備品販売会・廃校図書譲渡会の開催

廃校となった旧天津小学校及び旧育英小学校の2校で新たな活用が決定するにあたり、SDGsの観点からも、建物だけでなく思い出が詰まった備品も価値のある資産として循環させるべく、廃校備品の販売会及び図書の譲渡会を実施しました。備品販売会及び図書譲渡会の参加者数は2日間合計で745名となり、備品販売数は全備品の97.6%となる449品、図書譲渡数は2校合計で2473冊となりました。今後も、廃校だけでなく、学校の備品の有効活用も推進できるよう取組みを進めていきます。



〈廃校備品販売会・廃校図書譲渡会当日の様子〉

(3) 進捗状況に対する評価

ア 存続施設への取組み

後期実施計画では、総量削減の取組みに加えて、存続する施設の長寿命化や用途廃止した施設の民間への貸付など、多角的に取組みを進めることにより、将来の更新費の削減や財源の確保を図っていくこととしています。

令和3年度は、大正小学校及び日新中学校に関して、学校の長寿命化計画に基づく長寿命化改修を実施し、後期実施計画期間内における長寿命化の改修を完了としています。

また、額田児童館については、上夜久野児童館の機能を統合し、2つの児童館機能を統合しました。そして、上夜久野児童館の建物については、新たに人権ふれあいセンターさわやか館として活用するため改修を行いました。

存続対象となっている施設について、年度末到達度が「5（事業中）」となっている施設数が令和2年度は3施設でしたが、令和3年度は15施設と増加しており、個別施設計画による長寿命化等の改修が計画的に進んでいます。

イ 削減対象施設への取組み

令和3年度は、削減対象施設のうち、大部分を占めている「用途廃止（検討）」と「譲渡」の再配置区分となっている施設の取組が大きく進みました。

「用途廃止（検討）」となっていた施設については、廃校活用の取組効果もあり、4校の貸付が完了しています。貸付としているため、面積の削減には繋がっていませんが、施設の管理にかかる費用の削減に効果があります。

「譲渡」の対象である集会施設については、令和2年度は新型コロナウイルスの影響もあり、地元との協議を進めることが難しく、譲渡が進んでいない状況がありましたが、令和3年度は地元との協議を徐々に増やしていくことにより、8施設の譲渡を完了することができました。今後も、地元との丁寧な協議を進め、集会施設等の譲渡を推進していきます。

ウ 公民連携の取組み

公共施設マネジメント基本計画に基づき、廃校において民間活力の導入をすすめ、閉校した小学校等の利活用を積極的に推進していますが、16校あった廃校のうち、この3年間で50%以上にあたる9校の利活用方針が決定しています。

令和3年度は、令和2年度に実施した「廃校マッチングバスツアー」の効果もあり、4校の廃校について再配置が完了しました。

利活用事業者について募集を行い、民間事業者への貸付により、キャンプ場やスケートボードパーク、スポーツ施設等として活用されることとなりました。


また、公園の利便性や魅力の向上を図るため、民間事業者によるカフェ等の収益施設の設置と、その収益の一部で公園内の整備を行う、Park-PFIの導入検討にあたり、民間事業者と意見交換を行うためのサウンディング型市場調査を実施しました。公民連携の取組みに関しては、廃校活用以外の取組も進めています。

(4) 今後の取組みの進め方について

ア 第2期公共施設マネジメント基本計画策定に向けた取組みについて

今年度は、公共施設マネジメント基本計画の改訂を行い、策定時に試算した削減による効果と共に、前期実施計画の取組実績や個別施設計画で試算した長寿命化対策等による効果額を記載することで、計画の充実を図りました。今後は、「まちづくり構想 福知山」のビジョン実現に向け、後期実施計画に着実に取り組むとともに、第2期基本計画策定に向けた検討を進めます。

第2期基本計画の策定にあたっては、第1期基本計画期間内の取組内容や実績を踏まえ、新たな公共施設マネジメントの推進方法の検討及び多様化した公共施設マネジメントの取組を評価するための新たな評価指標の検討を行い、令和7年度に第2期基本計画及び実施計画をスタートすることとします。

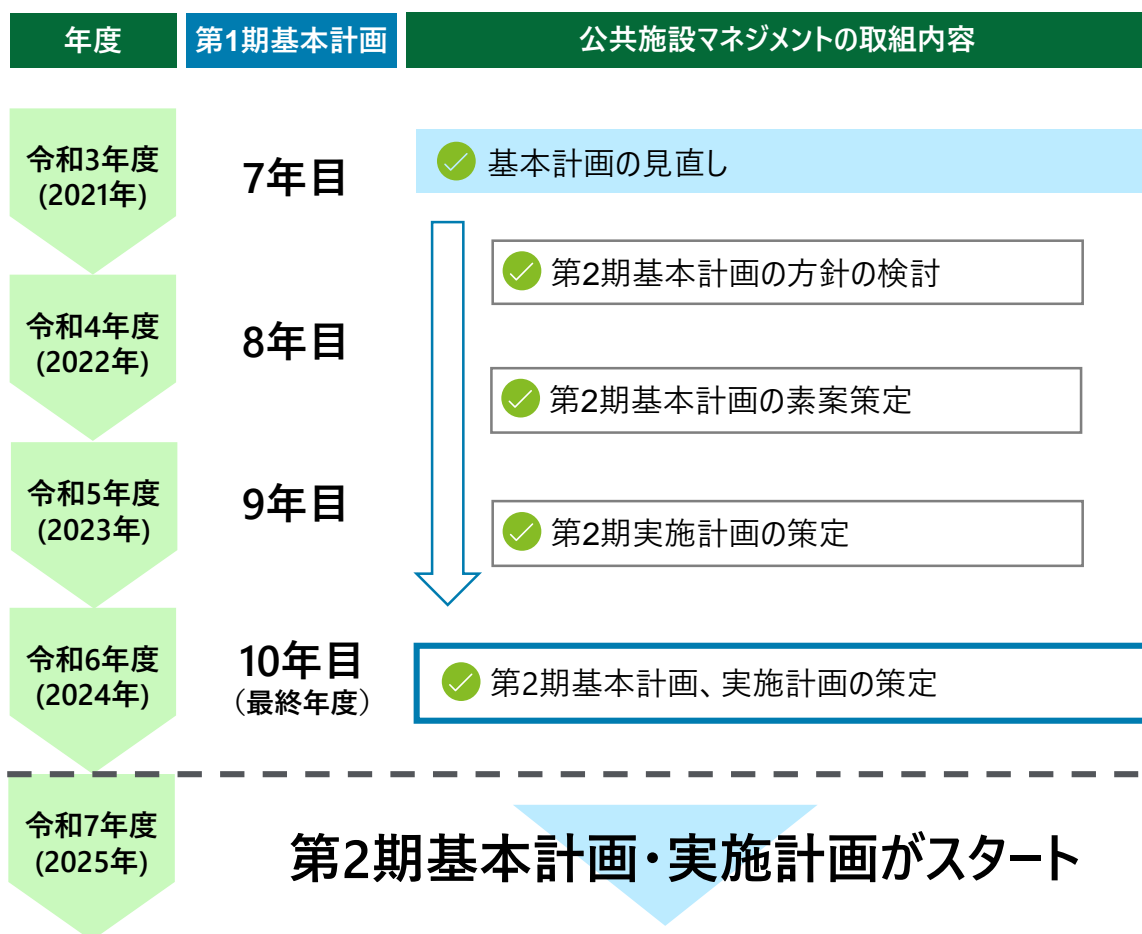

4 用途大分類 年度別進捗状況

(1) 公用施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	1	0	0	0
		2 着手済	0	1	0	0	0
		3 課題の明確化	1	0	0	0	0
		4 合意	5	4	0	0	0
		5 事業中	0	3	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	7	9	0	0	0
具体的な取組	福知山消防署東分署について、長寿命化計画に基づく長寿命化改修の事業中となっている。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●消防施設(4施設) 消防防災センター、福知山消防署北分署、修斉分団第2部(新庄)本部、佐賀分団第1部(私市・報恩寺)本部 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1施設) 三和支所 ●消防施設(2施設) 福知山消防署東分署、河守分団第3部(金屋) 					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
		到達度	R02	R03	R04	R05	R06
取組状況	施設数	1 未着手	5	2	0	0	0
		2 着手済	5	7	0	0	0
		3 課題の明確化	1	2	0	0	0
		4 合意	15	7	0	0	0
		5 事業中	9	7	0	0	0
		6 完了(当該年度)	9	10	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	9	0	0	0
		合計	44	44	0	0	0
	完了	年度削減面積	484	386	0	0	0
		累計削減面積	484	870	0	0	0
更新費削減額		192	133	0	0	0	
累計更新費削減額		192	324	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,399	1,399	0	0	0	
	累計更新費削減額	479	479	0	0	0	
具体的な取組	<p>【除却】 用途廃止した施設を除却した。 庵我分団第1部(城山)本部、庵我分団第2部池部班(池部)、修斉分団第1部(上荒河)、有路下分団第1部(三河・高津江)、有路下水防倉庫</p> <p>【譲渡】 消防施設の統廃合により、施設を用途廃止し、土地を所有者に返還し、建物を譲渡した。 庵我分団第2部中班(中)、三岳分団第1部(一ノ宮)本部、有路下分団第2部(二箇)</p> <p>【返還】 消防施設の統廃合により、自治会から借用していた土地・建物を自治会へ返還した。 三岳分団第2部(佐々木)、常願寺消防器具庫</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	●消防施設(7施設) 佐賀分団第2部(印内・山野口)、菟原分団第1部(菟原下)本部、菟原分団第2部(菟原中)、菟原分団第3部(高杉・友淵)、菟原分団第4部(大身)、下六長田北消防器具庫、河守水防倉庫					
	5 事業中	●消防施設(7施設) 上六分団第1部(生野)、上六分団第2部(三俣)本部、上六分団第3部(池田)、細見分団第5部(中出・西松)、上夜久野分団第4部(平野)、河守分団第3部(波美・上野)、池田水防倉庫					
	6 完了	●消防施設(10施設) 庵我分団第1部(城山)本部、庵我分団第2部中班(中)、庵我分団第2部池部班(池部)、修斉分団第1部(上荒河)、三岳分団第1部(一ノ宮)本部、三岳分団第2部(佐々木)、有路下分団第1部(三河・高津江)、有路下分団第2部(二箇)、常願寺消防器具庫、有路下水防倉庫					
備考							

(2) 教育施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	25	24	0	0	0
		3 課題の明確化	6	4	0	0	0
		4 合意	10	10	0	0	0
		5 事業中	2	3	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	2	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	43	43	0	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】 学校長寿命化計画に基づき、後期実施計画期間内に予定していた高架水槽及び防水・外壁改修工事が完了した。 大正小学校、日新中学校</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(6 施設) 庵我小学校、惇明小学校、昭和小学校、修斉小学校、雀部小学校、成仁小学校 ●中学校及び小中一貫校(4 施設) 桃映中学校、成和中学校、大江中学校、大江中学校体育館 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(1 施設) 旧三岳小学校 ●中学校及び小中一貫校(1 施設) 南陵中学校 ●学校給食センター(1施設) 福知山市学校給食センター 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(1 施設) 大正小学校 ●中学校及び小中一貫校(1 施設) 日新中学校 					
備考	<p>旧三岳小学校について、新三岳会館としての供用開始は R4 年度だが、集約化・複合化に向けた改修等が完了している。</p>						

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	2	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	9	1	0	0	0
		4 合意	16	14	0	0	0
		5 事業中	1	3	0	0	0
		6 完了(当該年度)	4	8	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	4	0	0	0
		合計	32	32	0	0	0
	完了	年度削減面積	2,435	0	0	0	0
累計削減面積		2,435	2,435	0	0	0	
更新費削減額		769	0	0	0	0	
累計更新費削減額		769	769	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	25,811	29,049	0	0	0	
	累計更新費削減額	5,979	6,571	0	0	0	
具体的な取組	<p>【貸付】サウンディングバスツアー等の取組を踏まえ利活用事業者を募集し、民間事業者に貸付を実施した。</p> <p>旧天津小学校、旧天津小学校体育館、旧公誠小学校、旧公誠小学校体育館、旧川合小学校、旧川合小学校体育館、旧細見小学校、旧細見小学校体育館</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(14 施設) 旧上六人部小学校、旧上六人部小学校体育館、旧金谷小学校、旧金谷小学校体育館、旧菟原小学校、旧菟原小学校体育館、旧明正小学校、旧精華小学校、美河小学校、美河小学校体育館、美鈴小学校、美鈴小学校体育館、有仁小学校、有仁小学校体育館 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(1 施設) 旧育英小学校 ●学校給食センター(2 施設) 旧夜久野学校給食センター、大江学校給食センター 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(8 施設) 旧天津小学校、旧天津小学校体育館、旧公誠小学校、旧公誠小学校体育館、旧川合小学校、旧川合小学校体育館、旧細見小学校、旧細見小学校体育館 					
備考							

(3) 公営住宅

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	1	0	0	0
		2 着手済	5	4	0	0	0
		3 課題の明確化	2	2	0	0	0
		4 合意	9	7	0	0	0
		5 事業中	0	3	0	0	0
		6 完了(当該年度)	1	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	0	0	0
		合計	18	18	0	0	0
具体的な取組	<p>PFI手法を用いてつつじが丘団地と向野団地の集約建替の方針で事業を進めている。 東堀団地及び旭が丘団地については、外壁改修工事を実施した。</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<p>●市営住宅(7施設) 宮ノ下団地、岡ノ三団地、広峯団地、夕陽が丘団地、南岡団地、矢見所団地、南佳屋野団地</p>					
	5 事業中	<p>●市営住宅(3施設) 東堀団地、旭が丘団地、つつじが丘団地</p>					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	14	11	0	0	0
		2 着手済	4	7	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	2	1	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	21	21	0	0	0
	完了	年度削減面積	0	103	0	0	0
		累計削減面積	0	103	0	0	0
		更新費削減額	0	29	0	0	0
		累計更新費削減額	0	29	0	0	0
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,091	3,091	0	0	0
累計更新費削減額		448	448	0	0	0	
具体的な取組	<p>【除却】用途廃止した施設を除却した。 門垣団地</p> <p>※向野団地のつつしが丘団地への統合について住民の合意を得ており、PFI手法を用いた集約建替を進めていく。</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	●市営住宅(1施設) 向野団地					
	5 事業中	●その他住宅(1施設) 新庄市営一戸建住宅					
	6 完了	●市営住宅(1施設) 門垣団地					
備考							

(4) 市民文化系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	1 未着手	23	22	0	0	0	
	2 着手済	5	6	0	0	0	
	3 課題の明確化	2	1	0	0	0	
	4 合意	4	4	0	0	0	
	5 事業中	0	1	0	0	0	
	6 完了(当該年度)	1	0	0	0	0	
	6 完了(昨年度まで)	0	1	0	0	0	
	合計	35	35	0	0	0	
具体的な取組	日新地域公民館について、長寿命化改修に向けた設計が完了した。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●市民会館・地域公民館(3 施設) 成和地域公民館(豊富農村環境改善センター)、六人部地域公民館、川口地域公民館 ●集会施設(1 施設) 東堀集会所 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●市民会館・地域公民館(1 施設) 日新地域公民館 					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0
		2 着手済	7	6	0	0	0
		3 課題の明確化	17	14	0	0	0
		4 合意	30	26	0	0	0
		5 事業中	25	25	0	0	0
		6 完了(当該年度)	3	9	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	3	0	0	0
		合計	84	84	0	0	0
	完了	年度削減面積	827	1,393	0	0	0
		累計削減面積	827	2,220	0	0	0
		更新費削減額	331	438	0	0	0
累計更新費削減額		331	769	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	11,943	12,670	0	0	0	
	累計更新費削減額	3,964	4,186	0	0	0	
具体的な取組	<p>【除却】 用途廃止した集会施設を除却した。 中田集会所</p> <p>【譲渡】 集会施設を地元へ譲渡した。 口田野公会堂、菟原下二総合会館、一尾林業会館、集落センター石本会館、樽水林業会館、構造改善センター岩間会館、下佐々木林業会館、河西上生活改善センター</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<p>●集会施設(26 施設) 小谷ヶ丘公民館、堀センター、惇明西集会所、惇明東公会堂、本町集会所、新庄集会所、駒場新町集会所、十三丘集会所、喜多公民館、観音寺公会堂、石原公会堂、平野町集会所、桔梗が丘集会所、菟原下二共同集会所、後野集会所、中夜久野集会所、千原共同集会所、金屋共同集会所、俊明多目的集会所、定住促進センター庵我会館、多目的集会施設下川口会館、多目的集会施設上六人部会館、多目的集会施設金山会館、夜久野町畑集落センター、多目的集会施設上夜久野構造改善会館、有路下多目的集会所</p>					
	5 事業中	<p>●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンターさわやか館</p> <p>●集会施設(24 施設) 一ノ宮教育集会所、堀口集会所(増築分)、駅南西陵集会所、緑ヶ丘集会所、偕和会館、室集会所、牧公民館、大野公民館、一ノ宮集会所、土師町公会堂、土師新町南公会堂、土師新町東公会堂、土師宮町公会堂、舟越会館、生活改善センター萩原会館、多目的集会施設六十内会館、多目的集会施設三岳会館、喜多生活改善センター、多目的集会施設天座会館、多目的集会施設興会館、構造改善センター戸田会館、多目的集会施設佐賀会館、台頭コミュニティセンター、一ノ宮老人施設</p>					
	6 完了	<p>●集会施設(9 施設) 口田野公会堂、菟原下二総合会館、中田集会所、一尾林業会館、集落センター石本会館、樽水林業会館、構造改善センター岩間会館、下佐々木林業会館、河西上生活改善センター</p>					
備考							

(5) 医療施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	1	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	1	1	0	0	0
具体的な取組	三和歯科診療所について、令和元年 11 月より診療を再開した。雨漏りが発生しているため、屋根の改修工事が必要であり、実施時期の検討をしている。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 三和歯科診療所					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	1	0	0	0
		5 事業中	2	2	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	3	3	0	0	0
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0
累計削減面積		0	0	0	0	0	
更新費削減額		0	0	0	0	0	
累計更新費削減額		0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	282	282	0	0	0	
	累計更新費削減額	102	102	0	0	0	
具体的な取組	三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)について、売却に向けて、令和2年度に実施した測量結果を基に、登記業務及び土地・建物についての不動産鑑定評価を実施した。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 国民健康保険 金谷診療所					
	5 事業中	●診療施設(2施設) 三岳診療所、三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)					
	6 完了	該当なし					
備考							

(6) 子育て支援施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	3	3	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	1	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	0	0	0
		合計	6	6	0	0	0
具体的な取組	【統合】上夜久野児童館の機能を統合した。 額田児童館						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	●児童館(1施設) 上夜久野児童館					
	6 完了	●児童館(1施設) 額田児童館					
備考	上夜久野児童館について、新さわやか館としての供用開始はR4年度だが、集約化・複合化に向けた改修等が完了している。						

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		3	3	0	0	0
		2 着手済		1	1	0	0	0
		3 課題の明確化		1	1	0	0	0
		4 合意		5	5	0	0	0
		5 事業中		1	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)		0	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)		0	0	0	0	0
		合計		11	11	0	0	0
	完了	年度削減面積		0	1,031	0	0	0
累計削減面積			0	1,031	0	0	0	
更新費削減額			0	325	0	0	0	
累計更新費削減額			0	325	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積		3,381	3,381	0	0	0	
	累計更新費削減額		1,002	1,002	0	0	0	
具体的な取組	<p>【譲渡】プロポーザルにより民間事業者を選定し、民間事業者に譲渡した。 下六人部保育園</p>							
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<p>●保育所(5施設) 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園</p>						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	<p>●保育所(1施設) 下六人部保育園</p>						
備考								

(7) 保健・福祉施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	1 未着手	0	0	0	0	0	
	2 着手済	0	0	0	0	0	
	3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
	4 合意	0	0	0	0	0	
	5 事業中	0	0	0	0	0	
	6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
	6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	
具体的な取組	現時点で後期実施計画期間中に長寿命化工事予定の施設なし。(維持管理修繕を除く。)						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
		到達度	R02	R03	R04	R05	R06
取組状況	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	1	1	0	0	0
		3 課題の明確化	3	3	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	2	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	2	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	6	6	0	0	0
	完了	年度削減面積	0	640	0	0	0
		累計削減面積	0	640	0	0	0
		更新費削減額	0	403	0	0	0
		累計更新費削減額	0	403	0	0	0
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	640	640	0	0	0
累計更新費削減額		403	403	0	0	0	
具体的な取組	<p>【譲渡】所有権移転登記が完了した。</p> <p>夜久野町ふれあいの里福祉センター、夜久野町ふれあいの里ミニデイサービスセンター</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●その他の社会福祉施設(1 施設) 夜久野町ふれあいの里福祉センター ●介護老人保健施設(1 施設) 夜久野町ふれあいの里ミニデイサービスセンター 					
備考							

(8) 産業系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	1	1	0	0	0
		4 合意	1	1	0	0	0
		5 事業中	0	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	4	4	0	0	0
具体的な取組	福知山鉱山坑廃水処理場について、長寿命化に向けた改修の事業に着手している。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	●産業振興施設(1施設) 食肉センター					
	5 事業中	●産業振興施設(1施設) 福知山鉱山坑廃水処理場					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	23	23	0	0	0
		3 課題の明確化	7	7	0	0	0
		4 合意	7	5	0	0	0
		5 事業中	2	4	0	0	0
		6 完了(当該年度)	1	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	0	0	0
		合計	40	40	0	0	0
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0
累計削減面積		0	0	0	0	0	
更新費削減額		0	0	0	0	0	
累計更新費削減額		0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	4,882	4,882	0	0	0	
	累計更新費削減額	2,311	2,311	0	0	0	
具体的な取組	公設地方卸売市場について、用途廃止に向けた補助金等の整理をしている。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(5施設) 新庄農作業所、新庄農機具保管庫⑥・⑦、新庄農機具保管庫⑨、石本農作業所、後野農機具保管庫 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(3施設) 下猪崎共同農作業所、下猪崎共同作業所、新町農業作業所 ●産業振興施設(1施設) 公設地方卸売市場 					
	6 完了	該当なし					
備考							

(9) 観光・宿泊(研修)施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	2	3	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	3	3	0	0	0
具体的な取組	三和荘のレストラン及び宿泊施設の運営方法について、事業者へのサウンディング等を実施した。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	13	11	0	0	0
		4 合意	2	3	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	1	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	0	0	0
		合計	17	17	0	0	0
	完了	年度削減面積	1,003	0	0	0	0
累計削減面積		1,003	1,003	0	0	0	
更新費削減額		178	0	0	0	0	
累計更新費削減額		178	178	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,359	2,395	0	0	0	
	累計更新費削減額	484	497	0	0	0	
具体的な取組	<p>【貸付】ファームガーデン夜久野の活性化に向けて、民間事業者に貸付を実施している。 ファームガーデンやくの 農林水産物処理加工施設(やくの花あずき館)</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●宿泊(研修施設)(2 施設) 旧三岳青少年山の家、森林総合利用施設(第2キャンプ場) ●観光施設(1 施設) 野鳥の森管理棟 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●宿泊(研修施設)(1 施設) 夜久野町緑の里交流センター 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●観光施設(1 施設) ファームガーデンやくの 農林水産物処理加工施設(やくの花あずき館) 					
備考							

(10) 生涯学習系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	7	7	0	0	0
		2 着手済	2	2	0	0	0
		3 課題の明確化	11	10	0	0	0
		4 合意	8	7	0	0	0
		5 事業中	0	2	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	28	28	0	0	0
具体的な取組	個別施設計画及び公園長寿命化計画に基づき施設の長寿命化等の取組を進めている。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●博物館(1施設) ファームガーデンやくの 林産物展示販売用施設(やくの木と漆の館) ●体育施設(体育館)(4施設) 成和地域体育館、六人部地域体育館、川口地域体育館、日新地域体育館 ●体育施設(運動場)(2施設) 三段池公園テニスコート、市民運動場 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●博物館(1施設) 児童科学館 ●体育施設(体育館)(1施設) 三段池公園総合体育館 					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		3	2	0	0	0
		2 着手済		1	1	0	0	0
		3 課題の明確化		2	2	0	0	0
		4 合意		3	3	0	0	0
		5 事業中		1	2	0	0	0
		6 完了(当該年度)		0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)		0	0	0	0	0
		合計		10	10	0	0	0
	完了	年度削減面積		0	0	0	0	0
累計削減面積			0	0	0	0	0	
更新費削減額			0	0	0	0	0	
累計更新費削減額			0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積		1,003	1,377	0	0	0	
	累計更新費削減額		395	530	0	0	0	
具体的な取組	夜久野地域公民館体育施設旧育英小学校について、文化財収蔵庫として利用するための整理を進めている。							
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 体育施設(プール)(1 施設) 三和町鹿倉運動公園プール ● その他施設(2 施設) 夜久野町太鼓練習場、夜久野町教育文化会館 						
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 博物館(1 施設) 新町文化センター ● 体育施設(体育館)(1 施設) 夜久野地域公民館体育施設旧育英小学校 						
	6 完了	該当なし						
備考								

(11) その他

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	1 未着手	0	0	0	0	0	
	2 着手済	0	0	0	0	0	
	3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
	4 合意	1	0	0	0	0	
	5 事業中	0	1	0	0	0	
	6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
	6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
	合計	1	1	0	0	0	
具体的な取り組み	齋場について、長寿命化の方針に基づき、火葬炉の耐熱煉瓦劣化部分の改修等を実施した。						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	●その他施設(1施設) 齋場					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
取組状況	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	1	1	0	0	0
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0
		累計削減面積	0	0	0	0	0
更新費削減額		0	0	0	0	0	
累計更新費削減額		0	0	0	0	0	
参考合意以上 (4~6計)	累計削減面積	84	84	0	0	0	
	累計更新費削減額	17	17	0	0	0	
具体的な取組	<p>教員住宅(上川合)の処分方法について、関係機関と協議を行っている。</p>						
取組状況の内訳 (R3年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●職員公舎(1施設) 教員住宅(上川合) 					
	6 完了	該当なし					
備考							
